

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Alt-Oberhausen									
Adolf-Feld-Schule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Außenwand ist trocken zu legen, im Anschluss erfolgt die Umsetzung voraussichtlich April / Mai 2019	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Fluren und Treppenhäusern - abgeschlossen (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Astrid-Lindgren-Schule	K	Anbau Villa			Planungskosten für 2019 angemeldet				
	K	Anbau Villa mit Souterrain			Planungskosten für 2019 angemeldet				
	K	Alternative Neubau an Schule			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst und zur Überarbeitung der bisherigen Pläne an die OGM GmbH übersandt.				2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Planungsphase läuft (HU)	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen (14+34), Treppenaufgängen und Fluren sind abgeschlossen. (35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Bismarckschule	M	Umbau Gruppenräume zu Mensa			Alternative Möglichkeit einer Abböschung zum Verbleib der Mensa im Keller wird durch die OGM geprüft. Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus - Umsetzung über KInvFöG II				2021
		Sanierung WC-Anlage	37.745 €	GS 2020	Lüftung wurde in den Sommerferien eingebaut.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Innensanierung Flur und Treppenhaus ist abgeschlossen. (20.000 €)	03.07.2017	X		2017
Brüder-Grimm-Schule		Erweiterung Mensa	383.200 €	GS 2020	Mensa ist im Betrieb. Eine Mängelliste wurde erstellt, die derzeit abgearbeitet wird.	03.07.2017	X		2018-2019
	K	Umbau KTE			Der Umzug der KTE in den Neubau ist abzuwarten - Planungen werden nochmals abgestimmt - Beschlussvorlage wird in 2019 erstellt.				2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Abstimmung zwischen HU und Schulleitung hat noch zu erfolgen. (Budget 20.000 €) Anstrich erfolgt im Zuge der Fertigstellung der ehem. KTE im Jahre 2019	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Concordiaschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Abstimmung mit Schulleitung ist erfolgt. Weitere Planungsschritte sind erforderlich. Umsetzung ab 2019 möglich. Beschlussvorlage soll in 2019 erstellt werden.	03.07.2017			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in den Räumen A6 und A10 und im Treppenhaus 2 des A-Gebäudes sind erfolgt; (25.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Falkensteinschule	K	Umbau OGS und Errichtung Anbau	840.000 €	KInvFöG II	Planungsvarianten und Kosten liegen vor. Verwaltungsinterne Abstimmung hinsichtlich favorisierter Planung ist erfolgt. Umsetzung in 2019 über KInvFöG II. Der Bauantrag wird gestellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Bauzeit: 9 Monate zzgl. Vorlaufzeit (s. Legende)	19.11.2018			2019 - Juli 2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (6 Klassenräume, 2 Treppenhäuser, 2 Flure, 2 Büros/Verwaltung) sind abgeschlossen. (25.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Havensteinschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planungen werden aufgrund des Bestands des Schulstandortes für den Einbau einer Küche aufgenommen.	03.07.2017			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten werden in den Osterferien 2019 ausgeführt. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Landweherschule	M	Umbau Förderschulbereich für Grundschule		GS 2020	Sukzessiver Rückzug der FS schreitet langsamer als prognostiziert voran - Planungen sind zu überarbeiten. Die Mensa soll mit Mitteln aus GS 2020 geplant werden.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Schulflur erfolgen zurzeit (Budget 15.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Luisenschule	M	Erweiterung Gruppenräume			Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus. Umsetzung über KInvFöG II				2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Treppenhaus ist gestrichen worden; (Budget: 25.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Marienschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Baubeginn im Dezember '18 erfolgt - geplante Fertigstellung KW 9	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (9 Klassen, Treppenhaus) sind abgeschlossen. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Rolandschule	L	Neubau Mensa	533.000 €	KInvFöG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Ein Grundrissplan wurde erstellt und muss nochmals überarbeitet werden. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure mit Treppenaufgängen, sämtl. Sockelflächen, Vorraum m. Jungenumkleide) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Ruhrschule		Umbau Hauptschule Alstaden	2.170.000 €	GS 2020	Bauantrag zur Erweiterung der Mensa ist in KW10 gestellt worden. Die Leistungsverzeichnisse werden erstellt. Die Arbeiten, die keine Baugenehmigung bedürfen, wurden von mehreren Unternehmen gleichzeitig aufgenommen, um die Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2019/20 zu ermöglichen. Ob eine Fertigstellung und ein Umzug bis zum Schuljahresbeginn gehalten werden kann, kann erst Ende April zugesagt werden.	24.09.2018	X		2018 - August 2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Es werden keine Maßnahmen durchgeführt	03.07.2017	X		
Schule am Froschenteich	K	Neubau Räume			Statikprüfung erfolgt. Planung und Kosten liegen vor. Eine Umsetzung kann nur über GS 2020 erfolgen. Aufgrund Kostenentwicklung erst ab 2020 möglich.				2020-2021
	K	Umbau Mensa/Klassenräume							
		Sanierung Turnhalle	95.200 €	GS 2020	Der Parkettboden wurde abgezogen und versiegelt; eine Wasserleitungssanierung in den Duschräumen & WC-Sanierung ist erfolgt	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten werden mit der Schulleitung abgestimmt (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Wunderschule	K	Erweiterung Mensa			Planungen gestoppt. Klärung baurechtliche Anbaumöglichkeit				2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Ausführung erfolgt in den Sommerferien.	03.07.2017	X		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Raum 2, 23, 24, 26 sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den Sommerferien. (Budget: 20.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Anne-Frank-Realschule		Sanierung Turnhalle	149.000 €	GS 2020	Duschräume und Toiletten wurden bearbeitet. Zugänge zur Turnhalle wurden verbreitert. Die Prallschutzwände wurden überarbeitet. Zum Abschluss fanden Malerarbeiten statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen	03.07.2017	X		2018
		Erneuerung Lüftungsanlage	447.000 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab 2019.	24.09.2018			2019
		Sanierung WC-Anlage	191.769 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen	03.07.2017	X		2018
		Sanierung Fachräume	444.000 €	GS 2020	Kostenermittlung liegt vor. Verwaltungsinterne Aufarbeitung erfolgt ab November 2018. Gespräche mit der Schulleitung werden anschließend nochmals geführt. Kostenzusammenstellung und Umsetzungsplanung wird mit separater Vorlage in 2019 vorgestellt.	03.07.2017			2019-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 133, 134, 212, 214, 230, 231 und Kunstraum 2) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2017

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Bertha-von-Suttner-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	376.500 €	GS 2020	Vorlage zur Umsetzung in 2019 wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt.	03.07.2017			2019-2020
		Neubau Räume			Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	28 Klassenräume wurden gestrichen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Elsa-Brändström-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Ausführung erfolgt in den Sommerferien.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	302.500 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung Turnhalle	108.500 €	GS 2020	Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018
		Fassadensanierung Gebäudeteil A	2.005.500 €	KInvFöG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 2019	24.09.2018			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure A-Gebäude: 1.- 6. OG und Vorflur Verwaltung) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Sanierung ist in Arbeit.	03.07.2017	X		2018-2019
Heinrich-Heine-Gymnasium		Sanierung Fachräume	128.500 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Errichtung Anbau	2.673.000 €	GS 2020	Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Mitte März soll das Aufmaß der Fenster erstellt werden. Im April sollen die Dachdeckerarbeiten beginnen. Bauzeitenplan wurde angepasst: Baubeginn KW 40 (Oktober) 2018 - Fertigstellung Oktober 2019	16.11.2017	X		2017-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	754.950 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab 2019.	24.09.2018			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (7 Klassenräume, 8 Flure, 1 Büro/Verwaltung, 1 Cafeteria) sind abgeschlossen (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Fasia-Jansen-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	100.000 €	GS 2020	Planungsphase läuft (HU)	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	284.000 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung Turnhalle	136.400 €	GS 2020	Die teilweise Erneuerung der Prallschutzwände ist erfolgt. Die Sanitär- und Fliesenarbeiten werden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Die Fassadenglaselemente wurden eingebaut. Die Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Großes Treppenhaus inkl. Etagengänge mit Decken und Geländern, Klassenräume 018, 121, 215) sind erfolgt; Abstimmung Dependance erfolgt derzeit. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Hans-Böckler-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage	156.301 €	GS 2020	Die Sanierungen sind abgeschlossen. (WCs der 2. Etage (Damen) inkl. 2 Behinderten WC. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume			Klärung zur Wiederherstellung eines zurückgebauten Biologieraumes hat noch zu erfolgen.				2019-2021
		Dachsanierung	775.000 €	GS 2020	Arbeiten beginnen im April 18.	16.11.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen 14 Klassenräumen sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den Sommerferien.(Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Hans-Sachs-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	475.000 €	GS 2020	Vorlage zur Umsetzung in 2019 wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt.	03.07.2017			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (12 Räume und die Flure 1. OG und 2. OG links) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Sterkrade									
Alsfeldschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Umbaumaßnahmen wurden im November 2018 abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Lichtgang Flur 1+2, Treppenhäuser 1-4, Notausgang) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018
Grundschule Buschhausen		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt	03.07.2017			2019-2021
	K	Zusammenlegung der Standorte			Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro werden Grundrisspläne erstellt.				2019-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Treppenhaus an Friesenstraße sind fertig gestellt; Malerarbeiten Treppenhaus, Nebenflur 1. OG sind fertig gestellt. (Budget: 20.000 von 40.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Hartmannschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Geplante und abgesprochene Bauzeit KW 14-KW 18	03.07.2017 24.09.2018	X		2019
		Pavillonersatzbau	1.635.000 €	KInvFöG	Das Mauerwerk und die Fensterstürze wurden erstellt. Die Filigrandeckenelemente wurden geliefert. Die Decke wird im März fertiggestellt. Geplante Baufertigstellung August 2019	21.11.2016			2017-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (1 Kopierraum, 1 Lehrerzimmer, 1 Flur Anbau, Räume 15+16) Maßnahme abgeschlossen (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Hirschkamp-schule	M	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependance Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen. Weitere Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus.	BV4 aus BP			
		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln.	03.07.2017			2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Am Standort Ravenhorst werden die Toiletten saniert, sofern keine Zusammenlegung der Standorte erfolgt. Das Prüfungsergebnis bleibt abzuwarten.	03.07.2017	X		2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Erste Malerarbeiten wurden vorgenommen.	03.07.2017	X		2018-2019
Kastellschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage soll in 2019 erstellt werden.	03.07.2017			2019-2021
		Sanierung WC-Anlage	190.689 €	GS 2020	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 7 Klassenräumen, Lehrerzimmer, Flur und der Verwaltung sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X		2018
Königschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage soll in 2019 erstellt werden.	03.07.2017			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Flur des Sporttraktes und am Eingang des Pavillons sind ausgeführt. (Budget: 13.000 von 20.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Melanchthon-schule	M	Neubau Klassenräume (wegen OGS-Ausweitung im Bestand)			Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen. Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Teilbereiche Treppenhaus und Eingangstüranlage) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Postwegschule		Neubau Mensa		KInvFöG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen.				2020-2021
		Umbau Hausmeisterwohnung			Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Nähere Prüfungen und Planungen erfolgen zusammen mit der Planung für die Mensa, da dann ein Umbau im Bestand vorgenommen werden muss.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten Neubau Treppenhaus, Flur Altbau, Treppenhaus Altbau sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Schule an der Oranienstraße		Zusammenlegung OGS / Mensa	273.700 €	GS 2020	Mensa ist fertiggestellt.	25.09.2017	X		2017
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; 8 Klassenräume sind gestrichen worden. Die Deckenflächen im Eingangsbereich des Altbaus sind in Arbeit. (Budget: 45.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Schwarze-Heide-Schule	L	Neubau Mensa		KInvFöG II	Abstimmungsgespräche mit 3-1 & OGM stehen aus. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen.				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (A7 bis A12) sind erfolgt; Malerarbeiten in Treppenhaus und Flur werden zurzeit durchgeführt. (Budget: 23.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Steinbrinkschule	K				Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wird gestellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt.				
		Aufstockung & ggfs. Erweiterung OGS	2.500.000 €	KInvFöG II	Es liegt eine Grenzüberschreitung von 30 cm vor, weshalb eine Baulasteintragung vorgenommen werden muss.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser und Flure) sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Förderschule an der Hagedornstraße		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; Arbeiten sind in der Dependance (Flur und Treppenaufgang vor Werk- und Klassenräumen) abgeschlossen und am Hauptstandort (Treppenhaus und Nebenflure/Türkischraum). (Budget: 50.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
		Fassadensanierung inkl. Sonnenschutz	200.000 €	KInvFöG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 2019	24.09.2018			2019
Friedrich-Ebert-Realschule		Sanierung WC-Anlage	140.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage ist in Arbeit.	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	282.500 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	490.000 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab 2019.	24.09.2018			2019
		Pavillonersatzbau			Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommt nur ein Ersatz am selben Standort oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Büro Konrektor, Teambesprechungsraum, Elternsprechzimmer, Lehrer WC Damen und Herren, 1 Flur, 2 Treppenaufgänge) sind zum Großteil erfolgt. Pausenhallendecken und Pfeiler sind in Arbeit. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Heinrich-Böll-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	80.000 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage ist in Arbeit.	03.07.2017	X		2018-2019
		Zusammenlegung mit Dependance			Damit die Hirschkampfschule den Standort der Dependance nutzen könnte, müsste die Dependance an den Hauptstandort verlegt werden. Eine erste Planung umfasste eine Überarbeitung der gesamten Schule mit mehreren An- und Neubauten. Machbarkeit ist zu prüfen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser im E-Gebäude und Flure EG + 1. OG, dazu 4 NW-Räume) sind abgeschlossen (Budget: 40.000 €)	03.07.2017	X		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Gesamtschule Weierheide		Sanierung Chemieraum	224.500 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus & Flure des A-Gebäudes / Buschhausen: Treppenhaus, Nebenflure 1-3 und Klassenräume E201-E205) sind abgeschlossen. (Budget: 50.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	135.656 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung Fachräume	318.000 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2019-2021
		Pavillonersatzbau			Bedarfsermittlung auch hinsichtlich einer Rückkehr zu G9 ist in Planung. Standortsuche und Kostenermittlung werden vorgenommen.				
		Sanierung Turnhalle	149.100 €	GS 2020	Malerarbeiten, Sanierung Duschräume, Türerneuerung, Austausch Außenlüfter, Dachdeckerarbeiten, Reparatur Hallendecke und -wand inkl. Prallschutz sind abgeschlossen.	03.07.2017	X		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus NW, Flure B-Gebäude, NW-Trakt und S-Gebäude, Treppengeländer A-Gebäude) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018
Sophie-Scholl-Gymnasium		Sanierung Fachräume	268.500 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2020-2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	611.500 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt 2019.	24.09.2018			2019
		Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume			Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen.				
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus 1+2, 4 Klassenräume) sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (Türen Oberstufengebäude und Lehrerzimmer) sind in Arbeit (70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Osterfeld									
Erich-Kästner-Schule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Die Planung ist mit der Schule noch im Detail abzustimmen. Eine weitere Begehung hat stattgefunden. Ein Raumbuch wird erstellt, um einen Abgleich mit der Schulbauleitlinie vorzunehmen. Beschlussvorlage soll in 2019 erstellt werden.	03.07.2017			2019
		Sanierung Turnhalle	155.700 €	GS 2020	Arbeiten werden zum Ferienende abgeschlossen sein.	03.07.2017	X		2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; (Budget 30.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019
Jacobischule	L	Neubau Mensa	533.000 €	KInVFöG II	Pläne müssen aufgrund fehlender Umkleideräume noch angepasst werden. Antrag auf KInVFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt.	19.11.2018			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 9 verschiedenen Räumen sind erfolgt; (Budget: 15.000 von 35.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Osterfelder-Heide-Schule	K				siehe Robert-Koch-Schule: Auflösung des Standortes und Umzug zur Hauptschule Eisenheim	03.07.2017			2018-2019
Overbergschule		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Detailplanung ist noch vorzunehmen (Entwässerung). Umsetzung in 2019 wird angestrebt,	03.07.2017			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhausflure) sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X		2017
Robert-Koch-Schule		Umbau Hauptschule Eisenheim	5.700.000 €	GS 2020	Eine Baugenehmigung für einen Neubau wurde beantragt. Der Abriss des Altbaus ist erfolgt. Restarbeiten sollten bis Ende März 2019 fertig sein. Der Boden ist noch zu ertüchtigen, da der Neubau größer als der abgerissene Altbau wird. Die Tragfähigkeit ist somit anzupassen. Das Leistungsverzeichnis für den Die Bauzeit für den Neubau wird ca. 12 Monate betragen. Für den Umbau des Bestandsgebäudes wurden die Leistungsverzeichnisse erstellt. Mit den Arbeiten werden derzeit ausgeführt.	03.07.2017/ 19.03.2018 24.09.2018	X		2018- Mai 2020
Schule am Siedlerweg		Umbau Küche	pauschal	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Geplante und abgesprochene Bauzeit KW 10 - KW 16	03.07.2017			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Klassenräumen und im Treppenhaus zwischen A&B-Gebäude sind erfolgt;Maßnahmen abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Schillerschule		Sanierung WC-Anlage	160.000 €	GS 2020	Sanierungen erfolgen an beiden Standorten - Planungsphase läuft (HU)	03.07.2017	X		2018-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFöG	Umsetzung erfolgt ab 2019.	24.09.2018			2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Schulleitung hat keinen Sanierungsbedarf gemeldet.	03.07.2017	X		2018-2019
Theodor-Heuss-Realschule		Sanierung Fachräume	351.000 €	GS 2020	Eine Vorlage über die Fachraum-Sanierungen und der notwendigen Budgetanpassung wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt. Eine Umsetzung erfolgt in 2020/2021	03.07.2017			2019-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Räumen sind erfolgt; (Budget: 7.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Gesamtschule Osterfeld		Sanierung Außen-WC-Anlage Gebäudeteil B	140.000 €	GS 2020	Planungsphase läuft (HU)	03.07.2017	X		2018-2019
		Sanierung WC-Anlage Gebäude C	320.000 €	KInvFöG	Baugenehmigung liegt vor. Erste Vergaben sind erfolgt. Die Arbeiten haben begonnen. Die Baufertigstellung ist in den Osterferien vorgesehen.	18.12.2017			2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen und im Flur sind erfolgt; (Budget: 38.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X		2017-2019
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage		GS 2020	Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine verwaltungsinterne Abstimmung hat nun zu erfolgen.	03.07.2017	X		2019-2021
		Sanierung Fachräume	239.000 €	GS 2020	Vorlage zur Umsetzung in 2019 wurde für die Ratssitzung am 01.04.19 erstellt.	03.07.2017			2019-2020
		Zusammenlegung mit Dependance	5.500.000 €	KIF II	Durch den Gestaltungsbeirat wurden Planungsänderungen gewünscht, die eingearbeitet und vom Gestaltungsbeirat positiv aufgenommen wurden. Der Bauantrag ist gestellt. Ein Antrag auf KInvFöG II wurde gestellt und wird vom Fördergeber geprüft. Da es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Ersatzbau handelt, ist diese Prüfung langwieriger. Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen. Fertigstellung somit in 25 Monaten (vgl. Legende).	19.03.2018			2018-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, im Café und Nebenfluren sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den Sommerferien. (Budget: 51.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 01.03.2019

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Stand	Laufzeit
Pauschalierte Beträge									
Umbau Küchen		Adolf-Feld-, Alsfeld-, Hartmann-, Marienschule & Schule am Siedlerweg	1.450.000 €	GS 2020	Finanzierungsbeschluss für die ersten 5 Küchen wurde am 24.09.18 eingeholt. Der Kredit wurde bewilligt.	03.07.2017 24.09.2018	X		2018-2019
Umbau Küchen			2.950.000 €	GS 2020					2019-2021
Innensanierung			1.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		
IT-Maßnahmen			2.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X		

Gesamtkosten (GS2020) **beschlossene Maßnahmen (GS2020) durch Kredite bereits bewilligt** 24.644.959 €
20.950.959 €

Finanzierungsbudget "Gute Schule 2020" in 2017 und 2018 **15.309.682 €**

Für 2019 und 2020 stehen dann jeweils 7.654.841 EUR zur Verfügung.

Anmerkungen & Legende

Die Kosten der Maßnahmen **Sanierung Fachräume, Sanierung Toilettenanlage, Umbau Mensen und Innensanierungen/Verschönerungsarbeiten** sind als jeweiliger Gesamtauftrag an die OGM GmbH vergeben. Detaillierte Einzelkosten werden nach Beendigung der Maßnahme mit der Schlussrechnung vorgelegt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist somit gegeben. In Klammern werden die bisher eingeplanten **Budgets der Innensanierung** angegeben.
Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse, die zur Kreditantragstellung berechtigen.

*) **BP** = Mit dem Bildungsplan wurde der Bedarf zum Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen in kurzfristig (**K**) und mittelfristig (**M**) unterteilt. Die übrigen nicht genannten Schulen haben einen nachrangigen Bedarf, der mit (**L**) gekennzeichnet wird. Eine Kennzeichnung erfolgt nur bei den Einzelmaßnahmen! Der Umbau der Mensen umfasst nur Schulen mit nachrangigem Bedarf. (Farblich Markiert sind die nun zur näheren Prüfung anstehenden Maßnahmen entsprechend Bildungsplan und Sozialindex)
Die Dringlichkeit an weiterführenden Schulen ist noch nicht beziffert, weshalb diese Maßnahmen vorerst mit "?" gekennzeichnet sind.
Kostenschätzung: Bei der Kostenschätzung handelt es sich um Beträge, die

a) bei vorliegendem Ratsbeschluss: dem Kreditantrag und dem Honorarvertrag mit der OGM zugrunde liegen

b) bei fehlendem Ratsbeschluss: noch abschließend ermittelt werden müssen

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**. Maßnahmen in der Planung werden nicht mit der Ampel beurteilt.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung und Schule erfolgt, Umsetzung erfolgt

gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen bzw. bei Innensanierungen sind noch keine Abstimmungen mit den Schulen erfolgt (Meldung OGM fehlt)

Stadt	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
Oberhausen	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Anwesende

Herr Simon Deichsel
 Herr Wolfgang Große Brömer
 Frau Marita Wolter
 Frau Kirsten Oberste-Kleinbeck
 Herr Hubert Cordes
 Herr Manuel Dröhne
 Herr Thomas Krey
 Herr Ulrich Real
 Herr Horst Wolter
 Herr Ralf Bohnes
 Frau Maren Großenbrink
 Frau Simone-Tatjana Stehr
 Frau Gundula Hausmann-Peters
 Herr Christian Benter
 Frau Karin Dubbert
 Herr Hans Josef Tschärke
 Herr Johannes Thielen
 Frau Sandra Gödderz
 Herr Andreas Blanke
 Herr David Driever Geschäftsführer
 Frau Stefanie Wehling
 Herr Michael Kirschner
 Frau Regina Boos Geschäftsführerin
 Frau Andrea-Cora Walther
 Herr Pater Ernst-Otto Sloat

Abwesende

Herr Klaus Kösling
 Frau Anja Kösling
 Frau Angelika Hillebrand-Bittner
 Herr Dieter Kalthoff

Verwaltung

Frau Elke Münich
 Frau Dr. Ute Jodan-Ecker
 Frau Anja Heiligenhaus

SI/16/2700

Ausdruck vom: 08.03.2019
 Seite: 1/9

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Herr Marc Uebing
Herr Fred Böttcher

Gäste

Herr Immanuel Schuler
Frau Doris Sawallich
Herr Björn Hermsein
Herr Thomas Meister
Frau Verena Thoer
Frau Ulrike Schönfeld-Nastoll
Frau Gudrun Wermert-Heetderks
Herr Marc Bücken
Frau Alice Bienk
Herr Alexander Mohr
Herr Sascha Reuen
Herr Dr. Holger Schmenk
Herr Marcus Kortmann
Herr Benjamin Ülsberg
Herr Thomas Dabels

Außerdem

Frau Gabriele Lützenkirchen-Modro
Herr Christoph Hegener

Stadt	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
Oberhausen	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL

- 1 Kenntnisnahmen
 - 1.1 Kurzreport Berufliches Gymnasium am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg: Ausgewählte Ergebnisse der Befragung der ersten beiden Jahrgänge
Vorlage: M/16/4302-01
 - 1.2 Bevölkerungsprognose für die Stadt Oberhausen von 2018 bis 2030
Vorlage: M/16/4199-01
 - 1.3 Bereitstellung von Mitteln für die Projektmanagement- und Planungskosten zur Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund, Kapitel 2 (KInvFG)
Vorlage: B/16/4281-01
 - 1.4 Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Vorplanung einer neuen Schule der Sekundarstufen 1 und ggf. 2 in Oberhausen
Vorlage: B/16/4282-01
 - 1.5 Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Verlagerung der Verwaltung in der Gesamtschule Osterfeld (GSO)
Vorlage: B/16/4285-01
 - 1.6 Umsetzung des Inklusionserlasses in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Oberhausen
Vorlage: M/16/4324-01
- 2 Vorberatungen
 - 2.1 Änderung der Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich
Vorlage: B/16/4313-01
- 3 Mitteilungen der Verwaltung

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

- 3.1 Seiteneinsteigerzahlen Dezember 2018
Vorlage: M/16/4322-01
- 3.2 Sachstand Förderrichtlinien Offener Ganzttag
- 3.3 Sachstand der Lehrerversorgung an Oberhausener Schulen zum 01. Februar 2019
- 3.4 Sachstand Gute Schule 2020
- 3.5 Sachstand „Errichtung des Bildungsgangs „Allgemeine Hochschulreife (Ingenieurwissenschaften)“ am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019 gem. Anlage D 15a der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) Fachbereich Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften (Berufliches Gymnasium für Technik)“

Sachstand „Errichtung eines Bildungsgangs „Dreijährige Berufsfachschule mit Berufsabschluss nach Landesrecht im Fachbereich Informatik (Staatlich geprüfte Informatikerin / Staatlich geprüfter Informatiker, Schwerpunkt Multimedia)“ am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019 gem. Anlage C 1 in Verbindung mit C 4, gem. § 2 Nr. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) Fachbereich Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften (Berufliches Gymnasium für Technik)“

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

Herr Große Brömer eröffnet am 23.01.2019 um 15:00 Uhr die 30. Sitzung des Schulausschusses und begrüßt die Anwesenden.

Die Einladung ist den Ausschussmitgliedern form- und fristgerecht zugegangen.

Frau Beigeordnete Elke Münich teilt mit, dass der TOP 1.6 „Umsetzung des Inklusionserlasses in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Oberhausen“ zurückgezogen werden muss. Es gibt Rückfragen bei der Bezirksregierung Düsseldorf, die einer Klärung bedürfen. Das Ergebnis wird im nächsten Schulausschuss den Teilnehmer*Innen zur Kenntnis gegeben.

Des Weiteren teilt Herr Große Brömer mit, dass Herr Bückner einen Sachstand zur Neueinrichtung eines Berufsschulzweigs abgeben möchte. Dieser Sachbericht soll unter dem TOP 3.5. abgehandelt werden.

Der geänderten Tagesordnung wird zugestimmt.

Mit der Einladung wurden den Ausschussmitgliedern die drei letzten Protokolle der Schulausschüsse vom 20.09.2018, 07.11.2018 und 05.12.2018 zur Verfügung gestellt.

Diese wurden ohne Wortmeldung genehmigt.

I. ÖFFENTLICHER TEIL

1. Kenntnisnahmen

1.1. Kurzreport Berufliches Gymnasium am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg: Ausgewählte Ergebnisse der Befragung der ersten beiden Jahrgänge Vorlage: M/16/4302-01

Frau Oberste Kleinbeck teilt mit, dass es sich um einen guten Bericht handelt. Sie fragt nach, ob diese Vorgehensweise auch auf andere Schulen übertragen wird und man zukünftig weitere Berichte erwarten kann.

Frau Boos schließt sich Ihrer Vorrednerin an und merkt an, dass auch der praktische Teil den Schwierigkeitsgrad des Abiturs heraushebt.

Lt. Frau Hausmann-Peters ist es erfreulich, dass der Bildungsgang positiv aufgenommen wird.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

1.2. Bevölkerungsprognose für die Stadt Oberhausen von 2018 bis 2030 Vorlage: M/16/4199-01

Frau Schönfeld-Nastoll führt aus, dass regelmäßig Bevölkerungsprognosen erstellt werden. Hier

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

fließen ortsnahe Kenntnisse, die nur die Stadt Oberhausen hat und somit über die statistischen Möglichkeiten der Länder hinausgehen, mit ein.

Frau Hausmann-Peters regt an, diese Prognosen im Bildungsplan, bei den Klassenbildungen und Zügigkeiten zu Rate zu ziehen.

Frau Oberste-Kleinbeck vermeldet den positiven Trend, dass die Bevölkerung bis 2030 über 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegen wird. Diese Zahlen werden für den Bildungsplan benötigt.

Frau Walther merkt an, dass der Zuzug von außen ein großer Segen sei und dauerhaft viel für diesen Trend getan werden müsse.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**1.3. Bereitstellung von Mitteln für die Projektmanagement- und Planungskosten zur Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (Kln-vFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund, Kapitel 2 (KInvFG)
Vorlage: B/16/4281-01**

Die Vorlage wurde bereits am 17.12.2018 im Rat der Stadt Oberhausen beschlossen.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**1.4. Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Vorplanung einer neuen Schule der Sekundarstufen 1 und ggf. 2 in Oberhausen
Vorlage: B/16/4282-01**

Frau Hausmann-Peters merkt an, dass hier der zweite Schritt vor dem Ersten gemacht wird. Die Schulform ist noch nicht definiert, aber das Gebäude schon festgelegt. Wann ist mit der Vorlage der Verwaltung zu rechnen?

Herr Große Brömer erläutert den Mitgliedern des Schulausschusses, dass haushaltsrechtliche Gründe für die Erstellung der Vorlage ausschlaggebend waren. Die Mittelbereitstellung konnte in 2018 erfolgen und somit den Haushalt 2019 entlasten.

Frau Dr. Jordan-Ecker teilt mit, dass es neue Rahmenbedingungen bezüglich der Klassenstärken gibt und u. a. aus diesem Grund die Vorlage nicht vorliegt. Seit Januar 2019 ist ein neuer Schulentwicklungsplaner bei der Stadt Oberhausen beschäftigt. Für die nächste Sitzungsfolge wird eine entsprechende Vorlage in Aussicht gestellt. Auf Grundlage der Raumleitlinien wird die Gesamtplanung der neuen Schule erfolgen. Diese ist jedoch von der Schulform abhängig.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

- 1.5. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Verlagerung der Verwaltung in der Gesamtschule Osterfeld (GSO)
Vorlage: B/16/4285-01**

Der Bericht wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

- 1.6. Umsetzung des Inklusionserlasses in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in Oberhausen
Vorlage: M/16/4324-01**

Der Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen.

2. Vorberatungen

- 2.1. Änderung der Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Offenen Ganztagschule im Primarbereich
Vorlage: B/16/4313-01**

Frau Hausmann-Peters begründet die Enthaltung der CDU Fraktion bei der Abstimmung zur Änderung der Satzung der Stadt Oberhausen über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen des Offenen Ganztags im Primarbereich und teilt mit, dass ärmere Eltern auf jeden Fall zu unterstützen seien. Durch die Reduzierung der Einnahmen würde sich jedoch die Qualität der Ganztagsbetreuung nicht verbessern.

Frau Oberste-Kleinbeck gibt zu bedenken, dass es in der Vorlage nicht um die Qualitätsverbesserung des Ganztags ging, sondern darum, die Sozialschwachen durch hohe Beiträge nicht auszuschließen.

Frau Hausmann-Peters gibt zu bedenken, dass, wenn ein hoher Beitrag den Ausschluss von sozialschwachen Kindern bedeuten würde, dann jetzt schon die Zahl der Sozialschwachen Teilnehmer*Innen am OGS geringer ausfallen müsste. Das sieht sie jedoch aktuell nicht.

Daraufhin entgegnet Frau Boos, dass alleinerziehende Elternteile keine Wahl haben und ihr Kind betreuen lassen müssen um arbeiten zu können. Aus diesem Grund sollen Ärmere keine Beiträge zahlen.

Herr Große-Brömer fasst zusammen, dass die Vorlage mit Enthaltung der CDU Fraktion einstimmig vorberaten wurde.

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

3. Mitteilungen der Verwaltung

3.1. Seiteneinsteigerzahlen Dezember 2018 Vorlage: M/16/4322-01

Die Mitteilung wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

3.2. Sachstand Förderrichtlinien Offener Ganztag

Frau Dr. Jordan-Ecker teilt mit, dass einmalig die Zuwendung für den OGS durch die Bezirksregierung Düsseldorf um 11 % erhöht wurde (ca. 338.000,00 Euro). Ab August 2018 greift die bisherige 3 % Erhöhung. Der Eigenanteil der Stadt Oberhausen steigt dann ebenfalls um 3 %.

Die Mitteilung wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

3.3. Sachstand der Lehrerversorgung an Oberhausener Schulen zum 01. Februar 2019

Lt. Frau Dr. Jordan-Ecker liegen der Verwaltung derzeit noch keine Zahlen vor. Die Bezirksregierung Düsseldorf wurde bereits angeschrieben und gebeten, die Zahlen zur Verfügung zu stellen.

Frau Oberste-Kleinbeck beschreibt ein Defizit an Lehrkräften von 34 Stellen (43 %) in Oberhausen. Im Gegenzug sei in Mettmann eine Versorgung von 82 % gegeben. Sie fragt an, ob diese Unterbesetzung möglicherweise insbesondere auf die Ruhrgebietsstädte zutrifft.

Frau Boos teilt mit, dass es wichtig sei, die genauen Zahlen zu kennen, um so Defizite aufzuzeigen und entgegen arbeiten zu können.

Lt. Frau Lützenkirchen-Modro ist die Besetzung offener Stellen zurzeit wie in anderen Kommunen und Kreisen nicht leicht. Trotzdem konnten verschiedene Stellen besetzt werden. Ab dem 01.05.2019 steht ein neues Kontingent an auszuschreibenden Stellen zur Verfügung. Hierauf ist mit entsprechenden Bewerbungen zu rechnen. Die Grundversorgung der Schulen ist abgedeckt. Die Umsetzung des Lehrerzuweisungsverfahrens zum 01.02.2019 erfolgt zurzeit.

3.4. Sachstand Gute Schule 2020

Herr Dabels teilt mit, dass die aktuelle Liste in Allris einsehbar ist. Die Baumaßnahmen an den NW Räumen werden derzeit abgestimmt. Eine Vorlage hierzu wird es in der nächsten Sitzungsfolge geben.

Die Mitteilung wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

SI/16/2700

Ausdruck vom: 08.03.2019
Seite: 8/9

Stadt Oberhausen	23.01.2019 15:00 Uhr	Schulausschuss
	Wahlzeit 2014/2020	Niederschrift
30. Sitzung des Schulausschusses		
Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal, Schwartzstraße 72, 46045 Oberhausen		

- 3.5. Sachstand „Errichtung des Bildungsgangs „Allgemeine Hochschulreife (Ingenieurwissenschaften)“ am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019 gem. Anlage D 15a der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) Fachbereich Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften (Berufliches Gymnasium für Technik)“

Sachstand „Errichtung eines Bildungsgangs „Dreijährige Berufsfachschule mit Berufsabschluss nach Landesrecht im Fachbereich Informatik (Staatlich geprüfte Informatikerin / Staatlich geprüfter Informatiker, Schwerpunkt Multimedia)“ am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019 gem. Anlage C 1 in Verbindung mit C 4, gem. § 2 Nr. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) Fachbereich Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften (Berufliches Gymnasium für Technik)“


Herr Bücker, Schulleiter des Hans-Sachs-Berufskollegs, teilt den Mitgliedern des Schulausschusses mit, dass mittlerweile die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) unterzeichnet wurde, sodass die Bezirksregierung Düsseldorf den Antrag des Hans-Sachs-Berufskollegs genehmigen kann. Eine Einbindung in „Schüler-Online“ konnte unbürokratisch mit der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Schulträger abgestimmt werden.

Sachstand „Errichtung eines Bildungsgangs „Dreijährige Berufsfachschule mit Berufsabschluss nach Landesrecht im Fachbereich Informatik (Staatlich geprüfte Informatikerin / Staatlich geprüfter Informatiker, Schwerpunkt Multimedia)“ am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019 gem. Anlage C 1 in Verbindung mit C 4, gem. § 2 Nr. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskollegs (APO-BK) Fachbereich Technik mit dem fachlichen Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften (Berufliches Gymnasium für Technik)“

Zum Bildungsgang Staatlich geprüfte Informatikerin / staatlich geprüfter Informatiker führt Herr Bücker aus, dass die Bezirksregierung Düsseldorf diesem Bildungsgang wahrscheinlich eine Absage erteilt, da in der Nachbarstadt Duisburg ebenfalls neue Bildungsgänge mit dem Themenschwerpunkt Informatik angesiedelt werden sollen. Am Hans-Sachs-Berufskolleg könnte evtl. ein Bildungszweig „Software Entwicklung“ bei einer dreijährigen Lehrzeit genehmigt werden.

Die Mitteilung wird ohne Wortmeldung zur Kenntnis genommen.

Ende der Sitzung: 15:50 Uhr


 Große Brömer
 Vorsitzender
 SI/16/2700


 Böttcher
 Schriftführer

Ausdruck vom: 08.03.2019
 Seite: 9/9



Gründung einer neuen Schule in Oberhausen

31. Sitzung des Schulausschusses

Mittwoch, 27.03.2019

Rathaus Oberhausen, Ratssaal



Warum eine neue Schule?

Ziel: Reduzierung von Schulformwechslern in der Sek I

=> eine Maßnahme von mehreren z.B.

- Kultur des Behaltens fördern
- Elternberatung verstärken
- Fortbildung von Lehrern ausbauen
- Einrichtung von zusätzlichen Klassen ab Jg. 7 nach der Erprobungsstufe
- Einrichtung eines Hauptschulbildungsgang gem. §132 c als Übergangslösung



Welche SEK I Schulen sind laut Schulgesetz NRW möglich?

- Integrierte Systeme wie z.B. Gesamtschulen und Sekundarschule
- Gymnasien
- Realschule
- Hauptschulen

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?

- Nachfrage nach der jeweiligen Schulform muss zahlenmäßig nachgewiesen sein und für die kommenden 5 Jahre prognostisch gesichert sein (Schülerzahlentwicklung!)
- durch Wartelisten, Abweisungen dokumentiert
- Ggfs. belegt durch Elternbefragung – wenn die Bez. Reg. dies anmahnt (Elternwille!)



Berücksichtigung weiterer aktueller Entwicklungen:

- Inklusionserlass
- Internationale Vorbereitungsklassen (IVK)

Folge:

Kleinere Klassen (27er) lösen höhere Raumbedarfe aus



Beschlusslage

Bereich 3-3

Schule

04.07.16

Rat lehnt 6-Zügigkeit an Gesamtschule Weierheide ab, gleichzeitig Prüfauftrag zur Absenkung auf 6 Züge an Gesamtschule Osterfeld (s. Beschluss Bildungsplan).

18.12.17

Prüfauftrag durch den Rat (Drucksache Nr. A/16/3212-01)

„Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung eine anlassbezogene Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Hierzu sollen zunächst die Bedarfe festgestellt werden, um auf dieser Basis alle Möglichkeiten zur Errichtung einer neuen Schule zu prüfen und dem Rat der Stadt zur Entscheidung darzustellen.“

19.11.18

Rat der Stadt Oberhausen beschließt die Einrichtung eines Hauptschulbildungsganges gemäß § 132 c SchulG an allen drei Realschulen ab dem Schuljahr 2019/20.

Elternbefragung 2015

Abbildung 2: Ergebnisse der Elternbefragung 2015 – Gewünschte Schulform nach der Grundschule (Bildungsplan 2016-2020)

Schulform (Mehrfachnennung möglich)	Anzahl	Anteil in Prozent
Realschule	516	23,1
Gymnasium	1110	49,7
Gesamtschule	548	24,5
Förderschule	7	0,3
Eine andere Schule außerhalb von Oberhausen	55	2,5
Ich weiß es noch nicht	239	10,7
Antworten insgesamt	2235	

Quelle: Stadt Oberhausen, Bereich 4-5 Statistik, Elternbefragung im Rahmen des Bildungsplans 2016-2020.

Aus der Befragung zieht Dr. Rösner in seinem Gutachten folgende Schlussfolgerung: „Sowohl die Abschlusswünsche der Befragten als auch ihre Schulformpräferenzen verweisen auf einen Anstieg der elterlichen Bildungsaspiration. Die Stadt Oberhausen wäre daher gut beraten, für die künftige Nachfrage nach Schulen mit gymnasialen Standards und Abituroption hinreichende Aufnahmekapazitäten zu gewährleisten.“

(Gutachten Bildungsplan 2016-2020, Seite 120).

Bildung von Eingangsklassen im Bereich der Sekundarstufe I (hier nur Regelklassen)

Zügigkeit der Eingangsklassen an den Gesamtschulen, Regelklassen, 2013/14-2017/18

Schule	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Gesamtschule Osterfeld	8	7	7	6	6
Heinrich-Böll-Gesamtschule	6	6	6	6	6
Fasia-Jansen-Gesamtschule	6	6	6	6	6
Gesamtschule Weierheide	4	4	4	4	4
Gesamt	24	23	23	22	22

Zügigkeit der Eingangsklassen an den Realschulen, Regelklassen, 2013/14-2017/18

Schule	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anne-Frank-Realschule	5	4	5	5	5
Friedrich-Ebert-Realschule	4	5	5	6	5
Theodor-Heuss-Realschule	4	4	5	4	4
Gesamt	13	13	15	15	14

Quelle: © Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Quelle: Berechnung und Darstellung Bereich 3-3 Schule

Bildung von Eingangsklassen im Bereich der Sekundarstufe I (hier nur Regelklassen)

Zügigkeit der Eingangsklassen an den Gymnasien, Regelklassen, 2013/14-2017/18

Schule	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	4	4	5	4	4
Heinrich-Heine-Gymnasium	4	3	3	5	4
Elsa-Brändström-Gymnasium	4	4	4	4	4
Sophie-Scholl-Gymnasium	6	5	6	5	5
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	6	5	5	5	5
Gesamt	24	21	23	23	22

Quelle: © Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Quelle: Berechnung und Darstellung Bereich 3-3 Schule


Anmeldezahlen Sek I zum SJ 2019/20

(Stand: 12.03.19)

Schule	festgelegte Zügigkeit	Aufnahme- kapazität bzw. Aufnahmen	geplante Zügigkeit	Anmeldungen nach dem letzten Tag	Gesamtauf- nahmen 2019 (Stand: 12.03.2019)	Gesamtauf- nahmen 2018	Gesamtauf- nahmen 2017
Gesamtschule Osterfeld *	8	232	5-6	106	133	148	123
Heinrich-Böll-Gesamtschule	6	174	5	108	139	156	163
Fasia-Jansen-Gesamtschule	6	174	6	164	154	162	150
Gesamtschule Weierheide	4	116	4	164	116	116	116
Gesamtschulen Gesamt	24	696	20-21	542	542	582	552
Anne-Frank-Realschule	5	145	5	120	124	109	125
Friedrich-Ebert-Realschule	5	145	5	159	150	141	145
Theodor-Heuss-Realschule	4	116	4	90	93	135	110
Realschulen Gesamt	14	406	14	369	367	385	380
Elsa-Brändström-Gymnasium	5	145	3	87	90	113	92
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	5	145	5	152	150	118	105
Heinrich-Heine-Gymnasium	4	116	4	119	119	112	112
Freiher-vom-Stein-Gymnasium	5	145	4	85	108	130	145
Sophie-Scholl-Gymnasium	5	145	5	178	150	133	140
Gymnasien Gesamt	24	696	21	621	617	606	594
Gesamt	62	1.798	55-56	1.532	1.526	1.573	1.526

SchülerInnenzahlentwicklung der Schulformen


SuS an Oberhausener Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien in der Sekundarstufe I ab dem Schuljahr 2013/14

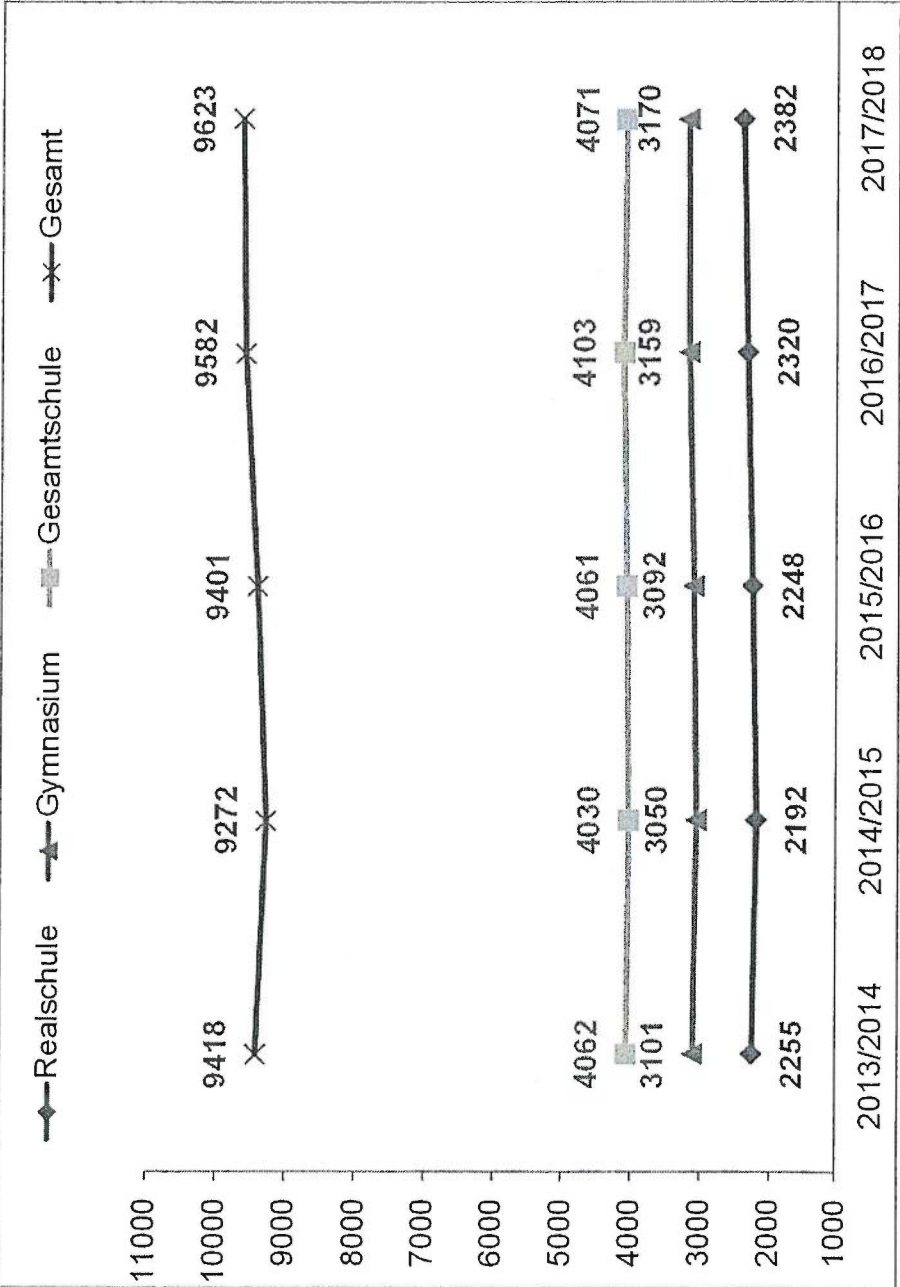

Quelle: © Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf; Quelle: Berechnung und Darstellung Bereich 3-3 Schule.

Bis zum SJ 2027/28 rd. 150-200 SuS mehr im 5. Jg.

Abbildung 27: Anzahl Kinder in Oberhausen nach Schuljahr des Übergangs zur Sekundarstufe

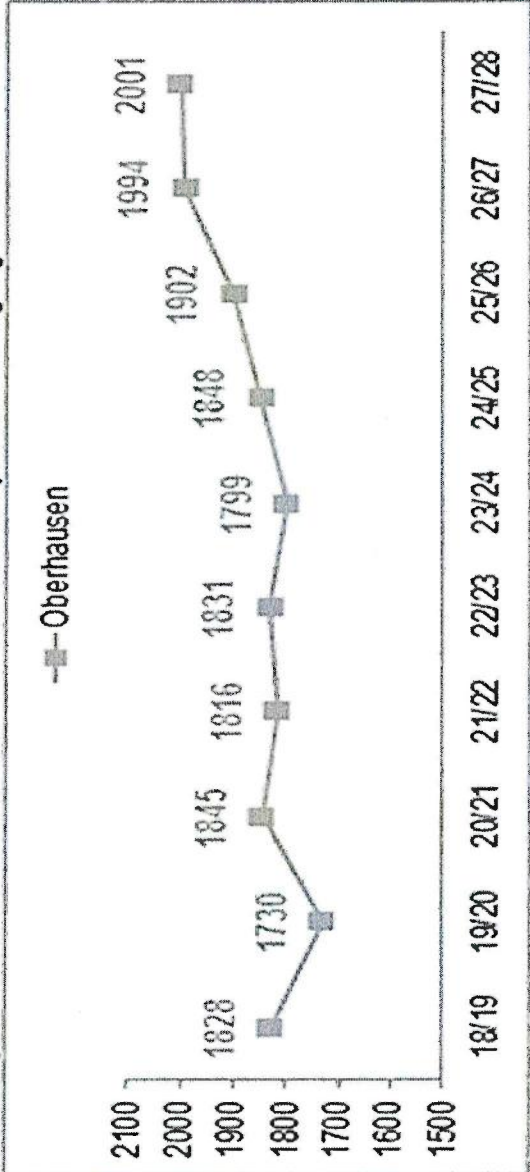

Quelle: Stadt Oberhausen, Bereich 4-5 Statistik, Berechnung und Darstellung Bereich 3-3 Schule.

Übergänge
2017/18: 1.534

Ermittelt aus
Kinderbestand
für Stadtgebiet

Anmerkung:

Die aktuelle Bevölkerungsprognose der Stadt Oberhausen weist auf bereits 2018 einsetzende Geburtenrückgänge sowie auf mittelfristig rückläufige Bevölkerungszahlen in den schulrelevanten Altersgruppen hin, die im Schuljahr 2028/29 in den weiterführenden Schulen auswirken werden.

Folgerung

- Bei unveränderter Klassengröße und Zügigkeiten an den bestehenden Schulen reichen die Kapazitäten aus, um die steigenden Schülerzahlen unterzubringen

Konsequenz

- große Klassen
- weiterhin zusätzliche Züge für Schulformwechsler ab Klasse 7

Prognose der ÜbergängerInnen in die Sek I/5. Jgst

(Berücksichtigung des Inklusionserlass mit 27er Klassenstärken an RS und IGS)

Schulform der Sek I	Zügigkeit	Kapazität	19/20		20/21		21/22		22/23		23/24	
			SuS	Differ enz*	SuS	Differ enz*	SuS	Differ enz*	SuS	Differ enz*	SuS	Differ enz*
Realschule	OB-Süd	5	135	155	-20	167	-32	175	-40	165	-30	-30
	OB-Nord	9	251	248	3	257	-6	242	9	260	-9	-2
	gesamt	14	386	403	-17	425	-39	417	-31	426	-40	-32
Gesamt- schule	OB-Süd	6	164	341	-177	368	-204	383	-219	360	-196	-191
	OB-Nord	18	496	334	162	352	144	330	166	355	141	150
	gesamt	24	660	675	-15	720	-60	713	-53	715	-55	-41
Gymnasium	OB-Süd	14	406	273	133	295	111	307	99	291	115	119
	OB-Nord	10	290	360	-70	385	-95	359	-69	380	-90	-84
	gesamt	24	696	633	63	680	16	666	30	671	25	35
Gesamt	62	1742	1711	31	1825	-83	1796	-54	1811	-69	1780	-38

Annahmen der Prognosevariante:

- Alle Oberhausener Kinder verbleiben im Oberhausener Sek I-System (ohne Ein- und Auspendler)
- Für RS und IGS: 28 Klassen mit 27er Klassenstärke (GL) und 10 Klassen mit 29er Klassenstärke
- Davon: 6 an IGS → 5 in OB-Nord + 1 in OB-Süd; 4 an RS → alle in OB-Nord
- Für GY: alle Klassen mit 29er Klassenstärke
- Festgelegte Zügigkeiten wurden zugrunde gelegt

Welche Alternativen zur Errichtung einer neuen Schule bestehen, wenn die Schülerzahlentwicklung allein die Errichtung einer neuen Schule nicht rechtfertigt?

Mindestanmeldungen erforderlich zur Errichtung einer

Realschule:	56 SuS	entspricht	2 Züge
Sekundarschule:	75 SuS	entspricht	3 Züge
Gesamtschule:	100 SuS	entspricht	4 Züge
Gymnasium:	84 SuS	entspricht	3 Züge

Möglichkeiten

- Reduzierung von Zügen an bestehenden Schule z.B. 1 Zug an einer Realschule, 1 Zug an einem Gymnasium, 2 Züge an einer großen Gesamtschule (hier GSO von 8 auf 6 Züge) und Errichtung einer neuen 4-zügigen Schule an einem eigenen Standort
- Umwandlung einer bestehenden Schule der Schulform Realschule oder Gymnasium in eine andere z.B. in eine Sekundarschule oder eine Gesamtschule
- Erweiterung von Zügen an einer bestehenden Schule, z.B. an der Gesamtschule Weierheide

- Ein- und Auspendler


Einpender 5. Jgst		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Bottrop	Realschule	3	0	0
	Gesamtschule	3	1	2
	Gymnasium	2	2	0
	Gesamt	8	3	2
Dinslaken	Realschule	0	8	2
	Gesamtschule	0	0	0
	Gymnasium	1	0	0
	Gesamt	1	8	2
Duisburg	Realschule	4	2	3
	Gesamtschule	4	2	3
	Gymnasium	7	3	9
	Gesamt	15	7	15
Essen	Realschule	0	0	0
	Gesamtschule	0	1	3
	Gymnasium	9	10	6
	Gesamt	9	11	9
Mülheim	Realschule	2	0	2
	Gesamtschule	5	2	1
	Gymnasium	15	18	13
	Gesamt	22	20	16
Gesamt		55	49	44

Quelle: Bereich 3-3 Schule, Abfragen bei Nachbarkommunen, eigene Darstellung

- Ein- und Auspendler

Auspendler 5. Jgst		2015/2016	2016/2017	2017/2018
Bottrop	Realschule	3	3	5
	Gesamtschule	1	1	1
	Gymnasium	24	21	29
	Gesamt	28	25	35
Dinsklaken	Realschule	4	5	7
	Gesamtschule	1	0	2
	Gymnasium	5	8	14
	Gesamt	10	13	23
Duisburg	Realschule	0	0	2
	Gesamtschule	5	5	4
	Gymnasium	2	6	6
	Gesamt	7	11	12
Essen	Realschule	3	3	4
	Gesamtschule	1	6	5
	Gymnasium	9	9	3
	Gesamt	13	18	12
Mülheim	Realschule	13	7	8
	Gesamtschule	45	45	45
	Gymnasium	1	1	1
	Gesamt	59	53	54
Gesamt		117	120	136

Quelle: Bereich 3-3 Schule, Abfragen bei Nachbarkommunen, eigene Darstellung



Danke für die Aufmerksamkeit!
