

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Alt-Oberhausen										
Adolf-Feld-Schule		Umbau Küche	306.000 €	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Außenwand ist trocken zu legen, im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Kücheninstallation. Die Trockenarbeiten sind abgeschlossen. Die Umbauten sind im Bestand erfolgt und aktuelle erfolgt der Einbau sowie die Installation der Küche. Die Inbetriebnahme ist für den 18.11.2019 geplant. Die Maßnahme wurde fertiggestellt und es sind lediglich kleinere Restarbeiten sowie die Schlussrechnung erforderlich.	03.07.2017 24.09.2018	X			2018-2019
		Errichtung Anbau			Aufgrund der Schulentwicklungszahlen im Innenstadtbereich werden Differenzierungsmöglichkeiten, die auch als Klassenraum fungieren können benötigt. Eine Planung befindet sich hinsichtlich Ausfertigung und Standort im Abstimmungsprozess mit der Unteren Denkmalbehörde und der übrigen Beteiligten. Ein Termin mit der Schulleitung wurde für den 27.08. terminiert. Nach erfolgter Abstimmung können notwendige Beschlüsse eingeholt werden. Der Anbau soll zudem im Gestaltungsbeirat vorgestellt werden.					
		Innensanierung	in Ermittlung pauschal	KIF II GS 2020	Malerarbeiten in Fluren und Treppenhäusern - abgeschlossen (35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Astrid-Lindgren-Schule	K	Anbau Villa			Planungskosten für 2019 angemeldet					
	K	Anbau Villa mit Souterrain			Planungskosten für 2019 angemeldet - erneuertes Raumbuch für Architektin erstellt und übersandt. Die Planung wird überarbeitet.					
	K	Alternative Neubau an Schule			Der Raumbedarf wurde anhand der Schulbauleitlinie angepasst und zur Überarbeitung der bisherigen Pläne an die OGM GmbH übersandt. Ein Architekturbüro wurde eingeschaltet, die eine Vorplanung erstellt. Die vorgestellte Planung wird nochmals überarbeitet. Die allgemeine Bebaubarkeit der Flächen wird mit der Stadtplanung abgestimmt. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Die Fachplaner haben Untersuchungen vorgenommen, um eine Anbindung eines Anbaus zu prüfen. Eine aktuelle Vorlage für den Verwaltungsvorstand wurde erarbeitet.					2020-2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
		Sanierung WC-Anlage	48.700 €	GS 2020	Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung ab Beginn der Herbstferien 2019 bis Ende 2019 - Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Klassenräumen (14+34), Treppenaufgängen und Fluren sind abgeschlossen. (35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Bismarckschule	M	Umbau Gruppenräume zu Mensa		KIF II	Verschiedene Standorte (Verbleib im Keller, Umbau im Erdgeschoss oder der Ganztagsräume) werden hinsichtlich des Einbaus einer Mensa geprüft.					2021
		Sanierung WC-Anlage	39.543 €	GS 2020	Lüftung wurde in den Sommerferien'18 eingebaut.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Innensanierung Flur und Treppenhaus ist abgeschlossen. (34.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017
Brüder-Grimm-Schule		Erweiterung Mensa	577.844 €	GS 2020	Die Arbeiten waren abgeschlossen. Unabhängig der Baumaßnahme kam es zu einem Wasserschaden. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsfall.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
	K	Umbau ehem. KTE zu OGS	475.000 €	GS 2020	Der Umzug der KTE in den Neubau ist erfolgt und Planung ist konkret in Abstimmung mit der Schule vorgenommen worden (weiteres s. Beschlussvorlage Sitzung 18.11.2020). Der Bauantrag wurde am 20.11.2019 gestellt. Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor, jedoch finden die Abstimmungen zu Detailfragen mit dem Hauptunternehmer statt. Die Arbeiten im KTE-Gebäude sind fast abgeschlossen. Es stehen noch Restarbeiten an. Sobald die Freigabe vorliegt, kann das Gebäude für den OGS genutzt werden. Der bisherige OGS-Bereich im Schulgebäude wird anschließend wieder zu Klassenräumen hergerichtet. Baulich ist der Umbau fertiggestellt. In der 38. KW werden die Möbel ausstehenden geliefert.	18.11.2020	X			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Fenster in verschiedenen Klassenräumen gestrichen zudem 5 Fensterbänke erneuert. Die Arbeiten sind abgeschlossen. (17.000 EUR)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Concordiaschule		Umbau Küche	655.450 €	GS 2020	Abstimmung mit Schulleitung ist erfolgt. Ein politischer Beschluss ist am 23.03.2020 erfolgt. Die Arbeiten wurden aufgrund der Corona-Lage bereits aufgenommen. Die Schadstoffsanierung der Hausmeisterwohnung ist abgeschlossen. Die Mensa und der Durchbruch werden wie geplant erst in den Sommerferien erfolgen. Eine Ersatzstromanlagen wurde nachträglich durch die Bauordnung gefordert. Der Einbau der Küche ist erfolgt. Die Mensa ist in Betrieb gegangen.	03.07.2017 08.07.2019 23.03.2020	X			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in den Räumen A4, A6, A11 und A10 und im Treppenhaus 2 des A-Gebäudes sind erfolgt; (35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019
Falkensteinschule	K	Umbau OGS und Errichtung Anbau	1.700.000 €	KInvFG II	Planungsvarianten und Kosten liegen vor. Verwaltungsinterne Abstimmung hinsichtlich favorisierter Planung ist einschl. der Küchenplanung erfolgt. Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Der Bauantrag ist bewilligt. Im Bodengutachten wurden statische Probleme aufgezeigt. Durch zusätzlich notwendige Rüttelstopfsäulen kann die Problematik gelöst werden. Derzeit werden die Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung erstellt. Hinsichtlich der verlängerten Planungszeit wird mit dem Architekturbüro über die Einhaltung des Fertigstellungstermins gesprochen. Bauzeit: 9 Monate zzgl. Vorlaufzeit (s. Legende)	19.11.2018				2019 - Juni 2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (3 Klassenräume, 2 Treppenhäuser, 2 Flure, 2 Büros/Verwaltung, Vorflur WC-Anlage) sind abgeschlossen. (25.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Havensteinschule		Umbau Küche			Planungen werden aufgrund des Bestands des Schulstandortes für den Einbau einer Küche aufgenommen.	03.07.2017				2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 3-5 und 9-13) sind abgeschlossen. Arbeiten in den Räumen 6 und 10 sind ebenfalls abgeschlossen. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Landweherschule	M	Umbau Förderschulbereich für Grundschule			Sukzessiver Rückzug der FS schreitet langsamer als prognostiziert voran - Planungen sind zu überarbeiten. Die Mensa soll mit Haushaltsmitteln umgesetzt werden. Die Planung ist erstellt und freigegeben. Die Kosten werden hierfür ermittelt. Eine Umsetzung ist ab den Sommerferien 2020, nach dem Auszug der Förderschule, avisiert. Die Förderschule soll in die ehem. Otfried-Preußler-Schule ziehen. Die Förderschule ist ausgezogen. Der Umbau zur Installation einer Mensa wurde begonnen.					
		Innensanierung		HH-Mittel						2020-2021
			pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Schulflur, Räume 2 und 27 einschl. Nebenräume sind abgeschlossen. (35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Luisenschule	M	Erweiterung Gruppenräume			Planung wird überarbeitet und im Gestaltungsbeirat am 17.12.2019 vorgestellt. Aufgrund der Kritik aus dem Gestaltungsbeirat werden gestalterische Änderungen z. B. am Dach und Treppengerüst geprüft. Das Brandschutzgutachten sieht die Nähe zum Bestandsgebäude kritisch. Die neue Etage ist auf das WC-Gebäude zu versetzen, um den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Umplanung wurde vorgenommen. Der Bauantrag wird erstellt. Der Baubeginn wird in Absprache mit der Schulleitung auf Sommer 2021 verschoben. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch die Umplanung wird der Fertigstellungstermin Anfang Juni 2021 schwierig zu halten sein.	16.12.2019				
		Innensanierung		KInvFG II						2020/2021
			pauschal	GS 2020	Treppenhaus ist gestrichen worden; Restarbeiten in Abstimmung mit der Schule für die Herbstferien (30.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Marienschule		Umbau Küche	370.774 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Mensa ist fertig gestellt. Räume sind seit Mai 2019 im Betrieb. Zuwegung zur Außentüre ist noch pflastern.	03.07.2017 24.09.2018	X	liegt vor		2018-2019
		Sonnenschutzanlage	169.000 €	KInvFG	Die Maßnahme wurde durch den Fördergeber "laufend" gestellt. Ein Vertrag mit der OGM wurde gefertigt.					2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (9 Klassen, Treppenhaus) sind abgeschlossen. (Budget 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018
Rolandschule	L	Neubau Mensa	533.000 €	KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Das Planungsgelände wird aufgemessen, um einen amtlichen Lageplan für den Bauantrag zu haben. Bodenproben hinsichtlich der Tragfähigkeit wurden genommen. Ein Bodengutachten wird erstellt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Eine Vorstellung erfolgte am 21.05.2019 im Gestaltungsbeirat. Ein Baubeginn ist im Juli 2020 geplant, aufgrund der aktuellen Lage verzögert sich der Baubeginn. Die Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung wurden veröffentlicht. Die ersten Vergaben erfolgen in Kürze.	19.11.2018				2019-Sommer 2021
		Sonnenschutzanlage	121.000 €	KInvFG	Die Maßnahme wurde durch den Fördergeber "laufend" gestellt. Ein Vertrag mit der OGM wurde gefertigt.					2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure mit Treppenaufgängen, sämtl. Sockelflächen, Vorraum m. Jungenumkleide) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Ruhrschule		Umbau Hauptschule Alstaden	3.734.599 €	GS 2020	Der Schulbetrieb wurde aufgenommen. Restarbeiten werden im laufenden Betrieb erledigt. Die lauten Arbeiten wurden auf die Herbstferien verlegt. Das OGS-Gebäude ist erst in der 38.KW fertig. Der Ganzttag wird solange im gesamten Schulgebäude sichergestellt. Die Mensa ist fertig gestellt. Die letzten Arbeiten zum Einbau des Aufzugs an der Aula wurden vorgenommen. Die Kosten der Maßnahme werden durch die OGM GmbH zusammen getragen. Fest steht bereits, dass aufgrund des Zeitdrucks Baubeschleunigungsmaßnahmen notwendig wurden, die zu Mehrkosten geführt haben. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	24.09.2018	X	liegt vor		2018 - August 2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Schule am Froschenteich	K	Neubau Räume	2.827.000 €	GS 2020	Planung ist komplett in Abstimmung mit der Schule für die nebenstehenden Maßnahmen erfolgt. Es erfolgt eine Aufstockung des Gebäudes um zusätzliche Klassen unter Beachtung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus wird die Hausmeisterwohnung zu Schulzwecken umgebaut und eine Mensa wird installiert. Der Bauantrag wurde gestellt und derzeit erfolgt die Einholung der Stellungnahmen durch die Genehmigungsbehörde. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Ausführungsplanung steht noch aus.	18.11.2019				2020-2021
	K	Umbau Mensa/Klassenräume								
		Sanierung Turnhalle	79.715 €	GS 2020	Der Parkettboden wurde abgezogen und versiegelt; eine Wasserleitungssanierung in den Duschräumen & WC-Sanierung ist erfolgt	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Räume 2 und 6 wurden in den Osterferien saniert. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018
Wunderschule	K	Erweiterung Mensa		KInvFöG II	Die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des OGS-Bestandsgebäudes liegen vor. Die Planungen wurde den aktuellen Anforderungen entsprechend aufgenommen. Ein erster Entwurf wird verwaltungsintern geprüft.					2021-2022
		Sanierung WC-Anlage	79.686 €	GS 2020	Die Jungen WC-Anlage wird in der 3. KW fertig gestellt. Im Anschluss beginnen die Arbeiten an der Mädchentoilette. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2019
		Sonnenschutzanlage	175.000 €	KInvFG	Die Maßnahme wurde durch den Fördergeber "laufend" gestellt. Ein Vertrag mit der OGM wurde gefertigt.					2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Raum 2, 23, 24, 26 sind erfolgt; weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 20.000 von 30.000 €)	03.07.2017	X			2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Anne-Frank-Realschule		Sanierung Turnhalle	114.962 €	GS 2020	Duschräume und Toiletten wurden bearbeitet. Zugänge zur Turnhalle wurden verbreitert. Die Prallschutzwände wurden überarbeitet. Zum Abschluss fanden Malerarbeiten statt. Die Maßnahme ist abgeschlossen	03.07.2017	X	liegt vor		2018
		Erneuerung Lüftungsanlage	447.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Schöll-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Eine Umsetzung soll ab März 2021 erfolgen.	24.09.2018				2021
		Sanierung WC-Anlage	200.901 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 2 Behinderten-WCs wurden installiert.	03.07.2017	X	liegt vor		2018
		Sanierung Fachräume	444.000 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017				2021
		Küchensanierung	300.000 €	GS 2020	Errichtung einer Lehrküche und eines Technikraums in den Sommerferien 2020. Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit und bewilligt. Die Maßnahme wurde in den Sommerferien umgesetzt.	18.11.2020	X			2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Räume 133, 134, 212, 214, 230, 231 und Kunstraum 2) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017
Bertha-von-Suttner-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	234.509 €	GS 2020	Sanierung im Falkensteingebäude inkl. Errichtung eines Behinderten-WC abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung Fachräume	376.500 €	GS 2020	Die OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Durch statische Probleme im Bereich der Decke haben sich die Arbeiten verzögert. Die Ausstattung ist eingebaut.	03.07.2017 01.04.2019	X			2019-2020
		energetische Sanierung der Hochhausfassade -Ost -	250.000 €	KInvFG	Die Sanierung ist notwendig um Energie einzusparen. Die Westfassade wurde bereits vor einigen Jahren saniert. Da ein Relief die Fassade ziert, finden Prüfungen hinsichtlich des Schutzes dieses Kunstwerkes statt. Das Relief ist kein Kunstobjekt. Dementsprechend kann eine Fassadensanierung erfolgen.	16.12.2019				2020/2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
		Neubau Räume			Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 wurden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Ein weiterer Abstimmungstermin mit der Schule fand im Januar statt. Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten denkmalgeschützten Kirche, sind die Pläne und ggfs. der Standort zu überarbeiten.					
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Rückkehr G9 27 Klassenräume und Flur von 506 wurden gestrichen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. (70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019
Elsa-Brändström-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	137.204 €	GS 2020	Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt. Ausführung erfolgt in den Sommerferien. Die Maßnahme ist fertig gestellt.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung Fachräume	302.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Umsetzung erfolgt bis Dezember 2020.	03.07.2017	X			2020
		Sanierung Turnhalle	119.544 €	GS 2020	Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018
		Fassadensanierung Gebäudeteil A	2.900.000 €	KInvFG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung ab 47./48. KW 2019. Die Vergabe der Fassade ist durch Dringlichkeitsentscheidung erfolgt. Letzte Abstimmungen mit der Schule und der Schulverwaltung finden derzeit statt. Da zeitgleich 6 Räume während der Arbeiten nicht nutzbar sind, wird auf dem Schulhof der Unterstufe eine Raumzellenanlage mit 4 Klassenräumen für die Zeit der Arbeiten beauftragt. Die Raumzellen wurden im April geliefert und ist betriebsbereit. Bei der Öffnung der Fassade wurden gebundene Schadstoffe entdeckt. Durch die zusätzlichen Arbeiten kommt es bei der Umsetzung zu Verzögerungen. Die notwendige Schadstoffsanierung führt zwar zu Mehrkosten, diese sind aber nach Rücksprache mit der BZR Düsseldorf ebenfalls förderfähig. Die überplanmäßigen Mittel aufgrund der Mehrkosten durch die Schadstoffsanierung wurden per Dringlichkeitsentscheidung bereitgestellt. Der erste Bauabschnitt wird Ende Herbst fertiggestellt sein.	24.09.2018				2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flure A-Gebäude: 1.- 6. OG und Vorflur Verwaltung) sind abgeschlossen. Weitere Malerarbeiten erfolgen in den 2 kommenden Monaten (Budget: 62.000 von 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Heinrich-Heine-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	86.129 €	GS 2020	Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung Fachräume	128.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017				2021
		Errichtung Anbau			Die Arbeiten der Verblendung und der Treppenbauarbeiten erfolgen derzeit. Die Trockenbauarbeiten sind vergeben worden. Die Innenausstattung wurde abgestimmt und bestellt. Eine Kostensteigerung von rund 350.000 EUR wurde angekündigt. Bauzeitenplan: Fertigstellung in Abstimmung mit der Schulleitung Oktober 2019. Restabwicklung inkl. Außenanlage erfolgt bis einschl. März 2020. Nachträgliche Brandschutzaufgaben werden im laufenden Betrieb abgearbeitet. Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird abgerechnet.	16.11.2017	X			2017-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage			Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Abstimmungsgespräche mit der Schule und der Feuerwehr haben bereits stattgefunden. Umsetzung erfolgt ab März 2021.	24.09.2018				2020-2021
		Innensanierung	754.950 €	KInvFG	Malerarbeiten (6 Flure, Räume U1-U3 und U101 - U103; Klassentrakt 011-015, Räume 104 & 115, Wand Treppenhaus, Fachräume 206, 301, 304, 2 Büros) sind abgeschlossen (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
			pauschal	GS 2020						
Fasia-Jansen-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage			Planungsphase abgeschlossen - Umsetzung musste in Abstimmung mit der Schulleitung von den Herbstferien 2019 in die Sommerferien 2020 verschoben werden, da die Baumaßnahme rd. 5 Wochen dauern wird. Die Anlage ist wieder in Betrieb. Es fehlen noch vereinzelte Malerarbeiten.	03.07.2017	X			2020
		Sanierung Fachräume	100.000 €	GS 2020		03.07.2017	X			
		Sanierung Fachräume			Eine Detailplanung wird in 2020 erfolgen. Insbesondere die statischen Probleme können zu einer Verzögerung der Umsetzung führen. Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Die Umsetzung erfolgt von August bis Dezember.	03.07.2017	X			2020
		Sanierung Turnhalle	284.000 €	GS 2020	Die teilweise Erneuerung der Prallschutzwände ist erfolgt. Die Sanitär- und Fliesenarbeiten werden während des laufenden Betriebes durchgeführt. Die Fassadenglaselemente wurden eingebaut. Die Sanierung ist abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
			176.408 €	GS 2020						

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Großes Treppenhaus inkl. Etagengänge mit Decken und Geländern, Klassenräume 018, 121, 215) sind erfolgt; in der Dependance wurden 5 Klassenräume, die Sporthalle und 2 Treppenhäuser gestrichen. (Budget: 100.000 €) Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Hans-Böckler-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage	162.919 €	GS 2020	Die Sanierungen sind abgeschlossen (WCs der 2. Etage (Damen) inkl. 2 Behinderten WC zzgl 7 WC-Anlagen der 5.- 9. Etage. Die Maßnahme ist fertiggestellt.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2020
		Sanierung Fachräume	250.000 €	HH-Mittel	Ein Ratsbeschluss wurde gefasst. Der Biologieraum wird ohne Zuschussmittel umgesetzt. Die Planungen sind abgeschlossen. Eine Umsetzung erfolgt von August bis Dezember 2020	16.12.2019				2020
		Dachsanierung	775.000 €	GS 2020	Arbeiten beginnen im April 2018. Fertigstellung erfolgte im Spätsommer 2020. Derzeit erfolgt die Schlussrechnung.	16.11.2017	X	liegt vor		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen 14 Klassenräumen sind erfolgt.(Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Hans-Sachs-Berufskolleg		Sanierung Fachräume	475.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Derzeit werden die Angebote ausgewertet. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Die Baumaßnahme der NW-Räume ist abgeschlossen. Für das Kfz-Labor fehlt noch die Lieferung der technischen Ausstattung.	03.07.2017 01.04.2019	X			2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (12 Räume und die Flure 1. OG und 2. OG links) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Sterkrade										
Alsfeldschule		Umbau Küche	274.714 €	GS 2020	Umbaumaßnahmen wurden im November 2018 abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X	liegt vor		2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Lichtgang Flur 1+2, Treppenhäuser 1-4, Notausgang) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018
Grundschule Buschhausen		Umbau Küche			Schulentwicklung ist abzuwarten - Umsetzung zuletzt	03.07.2017				2019-2021
	K	Zusammenlegung der Standorte			Standortprüfungen für Neubau sind anhängig - Planungskosten für 2019 sind angemeldet worden. Eine erste Besichtigung des Außengeländes ist erfolgt. Anhand des Raumbuches ist eine erste Prüfung hinsichtlich des benötigten Flächenbedarfs erfolgt. Eine Abstimmung mit der Stadtplanung/der Bauordnung hat zu erfolgen. Durch das Architekturbüro wurden Grundrisspläne erstellt, die in der Abstimmung mit Schulleitung und Verwaltung sind. Diese Pläne werden weiter konkretisiert.					2019-2023
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Treppenhaus an Friesenstraße sind fertig gestellt; Malerarbeiten Treppenhaus, Nebenflur 1. OG sind fertig gestellt. (Budget: 36.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Hartmannschule		Umbau Küche	278.783 €	GS 2020	Mensa ist fertiggestellt. Räume sind im Betrieb.	03.07.2017 24.09.2018	X	liegt vor		2019
		Pavillonersatzgebäude	1.635.000 €	KInvFG	Bis auf kleinere Restarbeiten ist das Gebäude fertig gestellt worden. Vorstellung erfolgte auf Wunsch der Schulleitung beim Schulfest am 28.09.2019. Derzeit erfolgt die Erstellung der Schlussrechnung. Beendigungsanzeige wurde gefertigt.	21.11.2016				2017-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (1 Kopierraum, 1 Lehrerzimmer, 1 Flur Anbau, Räume 15+16) Maßnahme abgeschlossen (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Hirschkamp-schule	M	Zusammenlegung der Standorte			Ein Umbau mit gleichzeitiger Sanierung der Dependence Heinrich-Böll-Gesamtschule wurden geprüft. Die Verwaltung sieht noch Änderungsbedarf aufgrund hohem Kostenvolumen bei den bisherigen Planungen. Zudem sind Standortprüfungen noch nicht abgeschlossen.	BV4 aus BP				
		Umbau Küche			Schulentwicklung ist abzuwarten - für einen Kostenvergleich zwischen Zusammenlegung und notwendigem Ausbau an den Standorten ist eine Begehung der Schulen erfolgt, um den Aufwand für die Küchen zu ermitteln. Erste Pläne liegen vor. Für eine Gesamtbetrachtung der Situation (Zusammenlegung oder Standorte anpassen) werden noch Kosten zusammengetragen. Eine Überarbeitung des Raumbuches erfolgt. Eine erste Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt.	03.07.2017				2020-2021
		Sanierung WC-Anlage	pauschal 80.000 €	GS 2020	Am Standort Ravenhorst werden die Toiletten saniert. Das Angebotsverfahren läuft.	03.07.2017	X			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in Räumen 3-6 (Zum Ravenhorst) sind abgeschlossen. Am Zweig Walsumermark wurden der Pavillon, Raum 8 & 10, das Treppenhaus und 1 Flur im 1. OG gestrichen.	03.07.2017	X			2018-2019
Kastellschule		Umbau Küche	347.157 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X	liegt vor		2019-2021
		Sanierung WC-Anlage	199.699 €	GS 2020	WC-Anlage und Dachsanierung inkl. Installation von 2 Behinderten-WCs erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 7 Klassenräumen, Lehrerzimmer, Flur und der Verwaltung sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Königschule		Umbau Küche	287.832 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Die Planung der Gesamtmaßnahme wurde Mitte April 2018 der Verwaltung bekannt gegeben. Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X	liegt vor		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten im Flur des Sporttraktes, zur Aula und am Eingang des Pavillons sind ausgeführt. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Melanchthon-schule	M	Abriss des Klassencontainers und Neubau von 2 Klassenräumen und einem Nebenraum sowie des Sanitärtrakts	1.490.000 €	KInvFG	Pavillon- & WC-Ersatzbau zzgl. Neubau von Klassenräumen - Planungen eines Pavillonersatzgebäudes über KInvFöG I wurden aufgenommen. Beschluss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Kapitel 1, wurde am 16.12.2019 im Rat getroffen. Die Planung muss aus Kostengründen und ggfs. höherem Raumbedarf nochmals überarbeitet werden.	16.12.2019				2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Teilbereiche Treppenhaus und Eingangstüranlage) sind abgeschlossen. (Budget: 20.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018
Postwegschule		Neubau Mensa		KInvFG II	Planung zum Umbau der Küche hat ergeben, dass ein Neubau erforderlich ist. Umsetzung über KInvFöG II vorgesehen. Die Planungen werden jetzt weiter forciert. Eine Begehung mit einem Architekturbüro ist erfolgt.					2020-2021
		Umbau Hausmeisterwohnung			Die Hausmeisterin ist ausgezogen. Die Schule hat einen Bedarf an zusätzlichen Räumen. Nähere Prüfungen und Planungen erfolgen zusammen mit der Planung für die Mensa, da dann ein Umbau im Bestand vorgenommen werden muss. Eine Begehung der Hausmeisterwohnung hat stattgefunden. Eine Machbarkeitprüfung hinsichtlich der zukünftigen schulischen Nutzung erfolgt.					2021-2022
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten Neubau Treppenhaus, Flur Altbau, Treppenhaus Altbau sind abgeschlossen. (Budget: 25.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Schule an der Oranienstraße		Zusammenlegung OGS / Mensa	301.442 €	GS 2020	Zusammenlegung OGS und Mensa sind fertiggestellt. Die Maßnahme ist schlussgerechnet.	25.09.2017	X	liegt vor		2017
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	9 Klassenräume sind gestrichen und die Arbeiten an den Deckenflächen im Eingangsbereich des Altbaus sind abgeschlossen (Budget: 45.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019
Schwarze-Heide-Schule	L	Neubau Mensa		KInvFG II	Die Planungen werden wieder aufgenommen, wenn das Raumbuch angepasst worden ist. Anschließend findet ein Abstimmungsgespräch mit der Schulleitung statt.					2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen (A7 bis A12) und im Treppenhaus sind abgeschlossen. (Budget: 50.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Steinbrinkschule	K	Aufstockung & Erweiterung OGS	2.500.000 €	KInvFG II	Umsetzung ab 2019 über KInvFöG II. Weitere Änderungswünsche durch den Gestaltungsbeirat wurden ohne Mehrkosten eingearbeitet. Der Bauantrag wurde genehmigt. Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die geschätzte Bauzeit beträgt 12 Monate ab einem Baubeginn im Frühjahr 2020. Der Abbruch des Daches ist abgeschlossen. Beim Abriss des Daches ist ein Wasserschaden entstanden. Die Folgen werden noch ermittelt. Der Anbau im EG wird derzeit fertiggestellt und die Decke wird eingebracht.	19.11.2018				2019-2021
		Schulhofgestaltung		Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Sterkrade	Ein wettbewerbliches Verfahren zur Erarbeitung von Konzeptideen für die Umgestaltung des Schulhofareals durch drei parallel beauftragte Landschaftsarchitekturbüros findet statt. Eine Jury tagt im Juli. Das Gewinner-Büro nimmt die detailliertere Planung auf.					
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser und Flure) sind abgeschlossen. (Budget: 30.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Förderschule an der Hagedornstraße		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten sind abgestimmt; Arbeiten sind in der Dependance (Flur und Treppenaufgang vor Werk- und Klassenräumen) abgeschlossen und am Hauptstandort (Treppenhaus und Nebenflure/Türkischraum). (Budget: 60.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Herrichtung Otfried-Preußler-Schule als Dependance	1.800.000 €	HH-Mittel	Die Otfried-Preußler-Schule wird zur Dependance der Schule an der Hagedornstraße. In einem ersten Schritt werden die Klassen 1-5 im Sommer 2020 umziehen und der Standort Rechenacker aufgelöst. Die Planungen für die notwendige Inbetriebnahme ab Sommer 2020 wurden vorgenommen und abgestimmt. Der Hauptunternehmer wurde beauftragt, die dringend notwendigen Baumaßnahmen zu prüfen und Kosten zu ermitteln. Das Zeitfenster ist sehr begrenzt, weshalb Überstunden und Wochenendarbeiten bereits jetzt angewiesen wurden. Die Arbeiten wurden trotz Covid-19-Einschränkungen innerhalb des Bauzeitfensters durchgeführt. Der Schulbetrieb wurde aufgenommen.	16.12.2019				Februar - Juli 2020
		Anbau an Dependance	3.200.000 €	HH-Mittel	Zur Erweiterung der Dependance wurde die Genehmigungsplanung durch das Architekturbüro aufgenommen.	16.12.2019				2021 - 2022
		Fassadensanierung inkl. Sonnenschutz	400.000 €	KInvFG	Ausführungsplanung hat begonnen. Umsetzung wie geplant im Sommer 2020 erfolgt.	24.09.2018 16.12.2019				2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Friedrich-Ebert-Realschule		Sanierung WC-Anlage	137.556 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage ist abgeschlossen. Es entstand zudem ein Behinderten-WC (Mädchen).	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung Fachräume	282.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017				2021
		Erneuerung Lüftungsanlage			Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Schöll-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Eine Umsetzung soll ab März 2021 erfolgen.					
			490.000 €	KInvFG		24.09.2018				2021
		Pavillonersatzbau			Die Machbarkeit eines Abrisses des abgängigen Pavillons und dessen Ersatz werden geprüft. Standortsuche (es kommen ein Ersatz am selben Standort, an anderer Stelle oder eine Aufstockung in Betracht) und Bedarfsermittlung sind in Planung. Geplante Umsetzung evtl. mit Mitteln des KIF I oder II					
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Flurbereiche Sport und Küche, Büro Konrektor, Teambesprechungsraum, Elternsprechzimmer, Lehrer WC Damen und Herren, 1 Flur, 2 Treppenaufgänge), Sanierung Flurbereich 2. BA und Pausenhallendecke und Pfeiler sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Heinrich-Böll-Gesamtschule		Sanierung WC-Anlage	79.424 €	GS 2020	Die Sanierung der Toilettenanlage im B- und D-Trakt sind abgeschlossen. 1 Behinderten WC- entstand im D-Gebäude.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Zusammenlegung mit Dependance			Damit die Hirschkampfschule den Standort der Dependance nutzen könnte, müsste die Dependance an den Hauptstandort verlegt werden. Eine erste Planung umfasste eine Überarbeitung der gesamten Schule mit mehreren An- und Neubauten. Machbarkeit ist zu prüfen.					
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhäuser im E-Gebäude und Flure EG + 1. OG, dazu 4 NW-Räume) sind abgeschlossen (Budget: 40.000 €)	03.07.2017	X			2018
Gesamtschule Weierheide		Sanierung Chemieraum	224.500 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Umsetzung erfolgt von Oktober bis Februar.	03.07.2017	X			2020-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus & Flure des A-Gebäudes / Buschhausen: Treppenhaus, Nebenflure 1-3 und Klassenräume E201-E205) sind abgeschlossen. (Budget: 58.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium		Sanierung WC-Anlage	141.135 €	GS 2020	Die Sanierung ist abgeschlossen. 1 Behinderten-WC (Mädchen) ist entstanden.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung Fachräume	318.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist in Arbeit. Umsetzung erfolgt in 2020.	03.07.2017	X			2020
		Pavillonersatzgebäude			Bedarfsermittlung auch hinsichtlich einer Rückkehr zu G9 ist in Planung. Standortsuche und Kostenermittlung werden vorgenommen.					
		Sanierung Turnhalle	176.408 €	GS 2020	Malerarbeiten, Sanierung Duschräume, Türerneuerung, Austausch Außenlüfter, Dachdeckerarbeiten, Reparatur Hallendecke und -wand inkl. Prallschutz sind abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus NW, Flure B-Gebäude, Flure NW-Trakt und S-Gebäude, Treppengeländer A-Gebäude) sind abgeschlossen. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Sophie-Scholl-Gymnasium		Sanierung Fachräume	268.500 €	GS 2020	Umsetzung erfolgt in 2021	03.07.2017				2021
		Erneuerung Lüftungsanlage	611.500 €	KInvFG	Nach dem Ausbau der Lüftungsanlage wurde festgestellt, dass die Planung des Ingenieurbüros zum Einbau der neuen Anlage nicht umsetzbar ist, Eine Umplanung ist in Arbeit. Die Lüftungsanlage wird derzeit eingebaut.	24.09.2018				2019-2020
		Umbau Verwaltung / Neubau Klassenräume		Rückkehr G9	Änderungsbedarf und Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Wiedereinführung G9 werden geprüft. Die Planungen sind an die neuen Bedarfe anzupassen. Weitere Abstimmungen mit der Schule hinsichtlich der Raumbedarfe sind terminiert. Ein Entwurf und eine Kostenschätzung werden erstellt.					
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhaus 1+2, 4 Klassenräume) sind erfolgt; weitere Malerarbeiten (Türen Oberstufengebäude und Lehrerzimmer) sind abgeschlossen (70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Osterfeld										
Erich-Kästner-Schule		Umbau Küche			Die Planung ist mit der Schule noch im Detail abzustimmen. Eine weitere Begehung hat stattgefunden. Ein Raumbuch wurde erstellt, um einen Vorschlag zur Installation einer Küche zu unterbreiten. Eine Abstimmung mit der Schule ist erfolgt. Eine Umsetzung soll noch in den Osterferien vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses erfolgen. Eine Ratsvorlage für 23.03.2020 ist erstellt. Der Baubeginn wurde aufgrund der Coronalage vorgezogen. Schadstoffsanierung des Bodens und die Installationsarbeiten (Personal-WC) sind abgeschlossen. Die Decke ist demontiert. Ver- und Entsorgungsschlitze wurden fertiggestellt. Die Trockenbauarbeiten werden derzeit vorgenommen. Die Decke im Flurbereich ist abgesackt und musste zwingende erneuert werden. Hinzu kommt, dass die Elektroanlage erneuert werden musste. Die Inbetriebnahme der Mensa ist erfolgt.	03.07.2017 23.03.2020	X			2020
		Sanierung Turnhalle	386.155 €	GS 2020	Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Innensanierung	175.655 €	GS 2020	Malerarbeiten im Büro-Trakt sind erfolgt, weitere Malerarbeiten hängen von der Auswahl des Ortes für die Mensa ab (Budget 13.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Jacobischule	L	Neubau Mensa			Antrag auf KInvFöG II wurde vom Fördergeber angenommen und die Maßnahme anschließend "laufend" gestellt. Die Pläne wurden überarbeitet und im Gestaltungsbeirat Vorschläge zum Standort auf dem Schuhhof im Bezug auf das Bestandsgebäude. Der Neubau musste erneut überarbeitet werden, da die Anbindung an das Schulgebäude vorhandene Räume einschränkt. Der Bauantrag ist gestellt, die Ausführungsplanung wird vorgenommen.	19.11.2018				2019-2020
		Innensanierung	718.000 €	KInvFG II	Malerarbeiten in 9 verschiedenen Räumen sind erfolgt; weitere Arbeiten in 2 Klassenräumen, und 2 Treppenhäusern sind abgeschlossen (Budget: 35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019
Osterfelder-Heide-Schule	K				siehe Robert-Koch-Schule: Auflösung des Standortes und Umzug zur Hauptschule Eisenheim	03.07.2017				2018-2020

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Overbergschule		Umbau Küche	325.671 €	GS 2020	Planung mit Schule abgestimmt. Detailplanung ist noch vorzunehmen (Entwässerung). Beschlussvorlage wurde für die Sitzung des Rates am 08.07.2019 erstellt. Die Arbeiten sind abgeschlossen.	03.07.2017 08.07.2019	X	liegt vor		2019-2020
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten (Treppenhausflure vorne) sind abgeschlossen. Weitere Arbeiten erfolgen in den Herbstferien.	03.07.2017	X	liegt vor		2017
Robert-Koch-Schule		Umbau Hauptschule Eisenheim	7.410.000 €	GS 2020	Die Räume des Bestandsgebäudes wurden bedarfsgerecht hergestellt und gestrichen. Die Bauzeit für den Neubau wird ca. 12 Monate betragen. Der Rohbau des Neubaus wurde mittlerweile fast fertiggestellt, so dass bald der Dachdecker beginnen kann. Das Richtfest hat stattgefunden. Eine Fertigstellung ist bis Anfang der Sommerferien vorgesehen. Die Arbeiten laufen termingerecht. Zusätzlich wurden Kosten zur Sanierung der Fassade des Bestandsgebäudes, der Außenanlage und der Turnhalle ermittelt. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Sanierung der Turnhalle sind weitere Auflagen zu berücksichtigen. Ein Bauzeitenplan wird erstellt. Die Sanierung der Fassade wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Außenanlagen werden in diesem Jahr fertiggestellt.	03.07.2017/ 19.03.2018 24.09.2018	X			2018- Juli 2020
Schule am Siedlerweg		Umbau Küche	325.854 €	GS 2020	Maßnahme wurde beschlossen. Die Errichtung der Mensa abgeschlossen.	03.07.2017 24.09.2018	X	liegt vor		2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Klassenräumen, im Treppenhaus zwischen A&B-Gebäude und weiteren verschiedenen Räumen und Fluren sind erfolgt;Maßnahmen abgeschlossen. (Budget: 35.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2018
Schillerschule		Sanierung WC-Anlage	128.271 €	GS 2020	Sanierungen erfolgen an beiden Standorten: Umsetzung am Hauptstandort in den Sommerferien 2019 abgeschlossen. Die Arbeiten am Zweig Comenius wurden in den Herbstferien beendet.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Erneuerung Lüftungsanlage	392.000 €	KInvFG	Aufgrund der Probleme bei der Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgt auch hier eine Umplanung. Eine Umsetzung soll ab März 2021 erfolgen.	24.09.2018				2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Schulleitung hat keinen Sanierungsbedarf gemeldet.	03.07.2017	X			2018-2019

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
Theodor-Heuss-Realschule		Sanierung Fachräume	351.000 €	GS 2020	Der Antrag auf Mittel aus dem Finanzierungsprogramm Gute Schule 2020 ist bewilligt. Umsetzung erfolgt von Oktober bis Februar	03.07.2017	X			2020 - 2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in 2 Räumen und die Erneuerung von Decken im EG, Lehrerzimmer, Flur und den Räumen R4+R5 sind erfolgt; in den Herbstferien wurden weitere Malerarbeiten vorgenommen, die auch komplett abgeschlossen werden konnten, so dass in den Weihnachtsferien keine Malerarbeiten mehr erforderlich sein werden. (Budget: 67.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2017-2019
Gesamtschule Osterfeld		Sanierung Außen-WC-Anlage Gebäudeteil B	145.909 €	GS 2020	Sanierung erfolgt noch aktuell bis Ende 2019.	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
		Sanierung WC-Anlage Gebäude C	320.000 €	KInvFG	Die Neuerrichtung der Toilettenanlage in der ehemaligen Pausenhalle des C-Gebäudes ist in den Sommerferien 2019 abgeschlossen worden. Die Maßnahme ist beendet.	18.12.2017				2018-2019
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Die Malerarbeiten in verschiedenen Räumen und im Flur des A-Gebäudes (nicht vom möglichen Abriss wegen des Multifunktionskomplexes betroffen) sind erfolgt. Das Treppenhaus des C-Gebäudes wurde renoviert (Budget: 70.000 €). Auch diese Maßnahme ist abgeschlossen.	03.07.2017	X			2017-2019
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg		Sanierung WC-Anlage und Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung		HH-Mittel	Umsetzung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme: Umbauarbeiten im Bestand. Aufgrund der Zusammenlegung der Standorte ist der Verwaltungsbereich umzubauen. Eine Sanierung der WC-Hauptanlage wird hierbei berücksichtigt. Die Verwaltung muss verlegt und dadurch erweitert werden. Die Cafeteria ist aufgrund höherer Schüleranzahl ebenfalls zu vergrößern. Die ersten Planungen wurden vorgenommen. Eine Abstimmung mit der Schulleitung ist erfolgt.					2021

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
		Sanierung Fachräume	239.000 €	GS 2020	OGM wurde mit der Umsetzung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 01.04.2019 beauftragt. Das Ausschreibungsverfahren ist im Gange. Die Submission ist erfolgt. Die Lieferzeit beträgt 6 Monate. Eine Umsetzung erfolgt umgehend nach Lieferung. Aufgrund eines Fehlers bei Lieferanten, musste eine Nachlieferung veranlasst werden. Diese hat zu einer Verzögerung geführt. Die Lehrer*innen sind mittlerweile in die technische Ausstattung eingewiesen worden.	03.07.2017 01.04.2019	X			2019-2020
		Zusammenlegung mit Dependance	5.500.000 €	KInVFG II	Durch den Gestaltungsbeirat wurden Planungsänderungen gewünscht, die eingearbeitet und vom Gestaltungsbeirat positiv aufgenommen wurden. Der Bauantrag ist gestellt. Ein Antrag auf KInVFG II wurde gestellt und wird vom Fördergeber geprüft. Da es sich bei der vorliegenden Maßnahme um einen Ersatzbau handelt, ist diese Prüfung langwieriger. Die Bezirksregierung hat den Antrag an das Ministerium weitergeleitet und inzwischen auch diese Maßnahme "laufend" gestellt. Eine Bauzeit von 18 Monaten wird angenommen. Zahlreiche Ausschreibungen sind in Bearbeitung bzw. für den Spezialtiefbau und die Erdarbeiten haben die Submissionen stattgefunden. Es wurde seitens des Bereichs 5-6 die Zufahrt zur Baustelle über die Ackerstraße festgelegt. Grundsteinlegung erfolgte am 26.03.2020. Die Bodenplatte ist fertig gestellt. Der Rohbau soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die Maßnahme befindet sich innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens.	19.03.2018				2018-2021
		Innensanierung	pauschal	GS 2020	Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, im Café und Nebenfluren sind erfolgt; weitere Malerarbeiten in verschiedenen Räumen sind in den Sommerferien erfolgt. (Budget: 70.000 €)	03.07.2017	X	liegt vor		2018-2019
Pauschalierte Beträge										
Umbau Küchen		Adolf-Feld-, Alsfeld-, Hartmann-, Kastell-, König-, Marien-, Overbergschule & Schule am Siedlerweg		GS 2020	Finanzierungsbeschlüsse für 8 Küchen wurden eingeholt. Der Kredite wurden bewilligt. Näheres s. o.	03.07.2017 24.09.2018	X			2018-2019
Innensanierung			1.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X			
IT-Maßnahmen			2.900.000 €	GS 2020		03.07.2017	X			

Sachstandsliste aller Fördermaßnahmen und Planungen an Schulen

Sachstand: 26.08.2020

Schule	BP*	Maßnahmen	Kosten-schätzung	Förder-maßnahme	Sachstand	Ratsbe-schluss vom	Antrag NRW-Bank	Schluss-rechnung	Stand	Laufzeit
--------	-----	-----------	------------------	-----------------	-----------	--------------------	-----------------	------------------	-------	----------

Finanzierungsbudget "Gute Schule 2020" 2017 bis 2020

30.619.364 €

Eine Abarbeitung kann noch bis Ende 2023 erfolgen.

Allgemeine Anmerkung hinsichtlich Covid-19-Pandemie

Zu Beginn der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollten auch die Baustellen stillgelegt werden. Zur Vermeidung dadurch entstehender Kurzarbeit in den Handwerksbetrieben und der dadurch entstehenden Verzögerungen der Bauzeiten wurden Lösungen für die städtischen Baumaßnahmen erarbeitet. Verschiedene durch die Bezirksregierung Düsseldorf geforderte Bedingungen (Einrichtung Duschen, Maßnahmen zur verstärkten Hygiene, nur ein Gewerk darf einzeln auf der Baustelle arbeiten, etc..) wurden erfüllt. Dennoch werden sich die Bauzeitenpläne zum Teil verschieben. Mehrkosten können aufgrund der schwierigeren Koordination der Gewerke nicht ausgeschlossen werden.

Anmerkungen & Legende

Die Kosten der Maßnahmen **Sanierung Fachräume, Sanierung Toilettenanlage, Umbau Mensen und Innensanierungen/Verschönerungsarbeiten** sind als jeweiliger Gesamtauftrag an die OGM GmbH vergeben. Detaillierte Einzelkosten werden nach Beendigung der Maßnahme mit der Schlussrechnung vorgelegt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist somit gegeben. In Klammern werden die bisher eingeplanten **Budgets der Innensanierung** angegeben.

Der Ratsbeschluss bezieht sich auf die Grundsatzentscheidung und nicht auf die notwendig folgenden finanziellen Beschlüsse, die zur Kreditantragstellung berechtigen.

*) **BP** = Mit dem Bildungsplan wurde der Bedarf zum Ausbau des Offenen Ganztags an den Schulen in kurzfristig (**K**) und mittelfristig (**M**) unterteilt. Die übrigen nicht genannten Schulen haben einen nachrangigen Bedarf, der mit (**L**) gekennzeichnet wird. Eine Kennzeichnung erfolgt nur bei den Einzelmaßnahmen! Der Umbau der Mensen umfasst nur Schulen mit nachrangigem Bedarf. (Farblich Markiert sind die nun zur näheren Prüfung anstehenden Maßnahmen entsprechend Bildungsplan und Sozialindex)

Die Dringlichkeit an weiterführenden Schulen ist noch nicht beziffert, weshalb diese Maßnahmen vorerst mit "?" gekennzeichnet sind.

Kostenschätzung: Bei der Kostenschätzung handelt es sich um Beträge, die

a) bei vorliegendem Ratsbeschluss: dem Kreditantrag und dem Honorarvertrag mit der OGM zugrunde liegen

b) bei fehlendem Ratsbeschluss: noch abschließend ermittelt werden müssen

Bauzeit: Ab Bauantragsstellung sind durchschnittlich 3 Monate bis zur Genehmigung zu rechnen. Die anschließende erste Ausschreibungsphase inkl. Ausführungsplanung dauert 4 Monate. Die Bauzeit hängt von der Größe des Gebäudes und der Aufwendigkeit zur Errichtung ab. Mindestens wird eine Bauzeit von 9 Monaten angenommen.

Stand = Der Bearbeitungsstand wird in Ampelform dargestellt für die Maßnahmen, die über einen **Grundsatzbeschluss verfügen**. Maßnahmen in der Planung werden nicht mit der Ampel beurteilt.

grün = Planung abgeschlossen - Abstimmungen mit Verwaltung und Schule erfolgt, Umsetzung erfolgt

gelb = Planungen der OGM und beauftragter Architekten laufen.

rot = Planungen noch nicht begonnen bzw. bei Innensanierungen sind noch keine Abstimmungen mit den Schulen erfolgt ggf. Meldung OGM fehlt

Fasia Jansen Gesamtschule



Schulversuch Talentschule



Bedürftig-
keit

LI
Kulturelle
Bildung

Schul-
träger



Auswahl der
Schulen

Bedürftig-
keit

LI
Kulturelle
Bildung

Schul-
träger



Geld
f. Fortbildung

Stellen
20%



SEB

Wiss.
Begl.

Geld
f. Fortbildung

Stellen
20%



SEB


Netzwerk


Wiss.
Begl.


Außen-
/Innen-
wirkung


Geld
f. Fortbildung


Stellen
20%














Der Schulversuch Talentschule am Hans-Sachs-Berufskolleg

TALENT.WERK.STATT.SCHULE

1. Bildungsgänge
2. Idee und Konzeptskizze
3. Didaktisch-pädagogische Bausteine
4. Schulorganisatorische Gelingensbedingungen

1. Bildungsgänge:

- Berufsfachschule B 1 und B1 (ca. 150 Schülerinnen und Schüler)
- Ausbildungsvorbereitung (ca. 120 Schülerinnen und Schüler)



Ziel	Pädag.-didakt. Bausteine	Konkretisierung	Besondere Maßnahmen	Verantwortlich	Zeit
1	TALENT.WERK.STATT	TALENT.WERK.STATT - Räume A 03 und A 04 - Zentrum der Talentschule - Umsetzung von technischen Projekten mit besonderen Talenten als didaktischer Prototyp, päd. FabLab - interdisziplinäre techn. Projekte - ca. 10 variable Projektstationen - Entwicklung von curricularen Projekten - Für und mit den anderen Werkstätten	Aufbau der Talentwerkstatt – Schulträgergespräche Umbau der Räume Sammeln von Ideen / Projekten Erstellen eines Curriculums Leistungstarke Schüler für ein Team aussuchen Teamstunden in den Stundenplan einbauen Starten der TALENT.WERK.STATT – Auswerten Einrichtung der Werkstatt mit Möbeln Technische Ausstattung der Werkstatt Projekträger- und Laborgestelle Simulationsanlage Industrie 4.0	Schulleiter Ing.-Lehrer StR Friese Werkstattlehrer StR Lörcks WL Schmitz WL Wasniak	2. Hj. 19/20 1. Hj. 20/21 2. Hj. 20/21
2	Sprachförderung	Im Teamteaching des Werkstattunterrichtes Kooperation mit der Uni Siegen	Personalsuche StR Pabst eingestellt (D und SoWi) Entscheidung für APP Card2Brain VHS online Erstellen eines Curriculums Sprachförder-Konzept ist erstellt - Sprachförderung in 1:1 Situationen - Erstellen eines Fachsprachenglossars in E und D - Schriftliche Übungen im W-Unterricht Beginn der Förderung C-Testung in Zusammenarbeit mit der Uni Siegen	Schulleiter 2 Deutschlehrer PEN PAB 1 Englischlehrer PAR	2. Hj. 19/20 1. Hj. 20/21 Ab Herbstf. 20 Sept. 2020
3	Matheförderung - Sprache	Sprachförderung im Mathematikunterricht für ein besseres Matheverständnis SiMa-Projekt	Kooperation mit Prof.Dr. Prediger Uni Dortmund Lehrkräfte: Mathe AG Erstellen eines Mathecurriculums Start des neuen Matheunterrichtes StR Weiss mit halber Stelle abgeordnet	StR Weiss Mathematiklehrer in B	2. Hj. 19/20 verschoben ab Herbst 20
4	Talentscouting	1. Talentscouting 2. Talentkolleg Ruhr; individ. Förderung 3. Ruhrtalente Schülerstipendium 4. Qualifizierung für Talentscouts	Erstellen eines Curriculums Start des Scoutings	Schulleiter Sozialarbeiterin Krause	2. Hj. 19/20 verschoben 1. Hj. 20/21 Herbst 20
5	außerschulische Praxiserfahrung	Schülerpraktikum für alle Schüler	Straffere Organisation Effizienz Verpflichtende Betreuung Evaluation	Abt.LtrIn Klassenlehrer	1. Hj. 20/21 Ostern 21
6	Arbeits- u. Sozialverhalten	Anwesenheit, Lernhilfen etc.	Kennenlernen der SuS, Analyse des AuS	Sozialarbeiterin Krause	1. Hj. 20/21
7	Förderunterricht	Förderpläne Einbindung des Lernzentrums	Auswertung der Klassenarbeiten, Testungen Einladen in das Lernzentrum	StRIn Burgsmüller	1. Hj. 20/21
8	Digitalisierung	Entwickeln eines Konzeptes Umsetzung	Schulung von 3 Lehrkräften - Sprach APP eingeführt Card2Brain und VHS online - Arbeit mit digitalen Endgeräten - Digitaler Führerschein	StR Weiß StRIn Burgsmüller n.n.	2. Hj. 19/20 verschoben 1. Hj. 20/21
9	Anschlussbegleitung	Jobcode-Training aller SuS KAoA	Zertifizierung von 5 Lehrkräften Potentialanalyse aller SuS	Sozialarbeiter n.n. n.n.	bis Juni 20 verschoben 1.Hj. 2020/21
10	Berufsfachschule Technik (B1/B2)	Neustrukturierung der 6 Fachrichtungen: Reduzierung auf Technik oder: Bau/Holz/Versorg und Metall/KFZ/Elektro	Prüfen bei BezReg und Ministerium 1.Hj. Durchlauf durch alle Werkstätten 2.Hj. Spezialisierung nach Neigung	Schulleiter BG-Leitungen	2021/22

Ziel	Organisatorische Bausteine	Konkretisierung	Besondere Maßnahmen	Verantwortlich	Zeit
1	Personaltableau	Leitung suchen StR Kemper 1 x Ing.Lehrer – Projektleitung 1 besetzt 1 x Werkstattlehrer 1 besetzt 1 x Mathelehrer beauftragt / n.b. 2 x Deutschlehrer 1 besetzt 1 x Sozialarbeiter 1 besetzt	Schnell ausschreiben; auf Homepage ausschreiben eventuell tauschen mit eigenen Lehrkräften bei OBAS Bewerbungen Personalsuche Neu eingestellt: 1 Deutschlehrer PBS 1 Sozialarbeiterin KRS 1 Ing-Lehrer MT FRS 1 Werkstattlehrer WAS Es fehlen noch 2,5 Stellen	Schulleiter	2. Hj. 19/20 teilweise und verschoben
2	Pädagogische Leitung	Verantwortlich für Gesamtkonzept Koordination von Teilkonzepten Entwicklen eines Curriculums		OSTD Bücken StRin Kemper	
3	Teamsitzungen	wöchentliche Teambesprechungen	Dienstag 7. und 8. Stunde	Leitung StR Krause	1. Hj. 20/21
4	TALENT.WERK.STATT	TALENT.WERK.STATT in A 03 und A 04 Antrag auf Umbau gestellt Ortsbesichtigung a. 29.09.2020 erfolgt Kostenermittlung Ausbau der Lernstationen	Einrichtung der Werkstatt mit Möbeln Technische Ausstattung der Werkstatt - 10 Lernstationen - Fischertechnik, 3D-Drucker, Simulationsanlage Industrie 4.0 - Projektträger- und Laborgestelle, Schränke - Arbeitsplatz Werkstattlehrer im Antrag	Schulleiter Ing.-Lehrer Werkstattlehrer n.n. StR Lörcks WL Schmitz	2. Hj. 19/20 1. Hj. 20/21 2. Hj. 20/21
5	Dienstzimmer für Leitung, Sozialarbeit, Beratung	Büro-Raum mit Möblierung	Umbau des Lagerraums Metall in ein Dienstzimmer Provisorium Raum A 06 ausgewählt / aber: noch nicht bezugsfertig, notdürftig eingerichtet 3 Schreibtische WL, SozArb, Leitung 1 Besprechungs- und Beratungstisch 1 Handwaschbecken / Spüle 3 Desktop PC Einbindung ins LAN	Schulleiter AbtLr Talentschule	Sommerferien 2. Hj. 20/21
6	Organisation Klassen-, Raumpläne, Personalpläne, Dienstaufsicht	Nach Vorgaben des Teams	...	AbtLr LIT Friedrichs StD Reschke	
7	Fortbildung / Schulentwicklung	Konzept und Zeitplan erstellen	Sitzungsplan fertiggestellt Arbeit hat begonnen 1. Vorgespräch zur Fortbildung		18.06.2020 Aug 2020 09.09.2020



31.08.2020

Schulanschlüsse der Stadt Oberhausen
41 von 73 in Zusammenstellung



Räumlichkeiten



31.08.2020

Schulansicht der Stadt Oberhausen
42 von 73 in Zusammenstellung



31.08.2020

Schulansicht der Stadt Oberhausen
43 von 73 in Zusammenstellung


TALENT.WERK.STATT.SCHULE

Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit
verliehen, etwas zu erreichen. Keinen
Menschen hat er ohne alle Talente
gelassen.

Martin Luther King

31.08.2020

Schulsausschuss der Stadt Oberhausen
44 von 73 in Zusammenstellung





Anlassbezogene Schulentwicklungsplanung zur Sekundarstufe I in Oberhausen 2020

Bericht aus der „Arbeitsgruppe
anlassbezogene Schulentwicklungsplanung“



Programm

- Aspekte der jüngeren Schulentwicklung
- Statistische Bestandsaufnahme zur Sek I
- Schüler*innenanzahlprognose
- Argumentation zum qualitativen Bedarf
- Varianten schulorganisatorische Maßnahmen
- Empfehlung der Verwaltung



ASPEKTE DER JÜNGEREN SCHULENTWICKLUNG



Bereich 3-3

Schule

Datum	Ereignis
21.08.17	Schulträgerberatung durch BezReg → folgende Optionen werden genannt • Vorübergehende Erweiterung der Zügigkeit an der Theodor-Heuss-Realschule ab Klasse 7 (Drucksache B/16/3400-01) • Einrichtung eines Bildungsganges nach § 132c SchulG NRW, vorzugsweise an der Theodor-Heuss-Realschule unter Einbeziehung der Räumlichkeiten der Albert-Schweitzer-Hauptschule • Schaffung von zusätzlichen Plätzen an einer Gesamtschule (Ausbau der Gesamtschule Weierheide oder eine mindestens vierzügige neue Gesamtschule) • „Hier sei etwa vorstellbar, die Zügigkeit an den Gymnasien um zwei Züge abzusenken (dies entspricht der Anzahl der Schulformwechsler), die Zügigkeit an den Realschulen (Anne-Frank-Realschule) zu beschränken sowie auf eine Beschränkung der Zügigkeit der Gesamtschule Osterfeld.“
18.12.17	Prüfungsantrag durch den Rat (Drucksache Nr. A/16/3212-01) • „Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung eine anlassbezogene Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Hierzu sollen zunächst die Bedarfe festgestellt werden, um auf dieser Basis alle Möglichkeiten zur Errichtung einer neuen Schule zu prüfen und dem Rat der Stadt zur Entscheidung darzustellen.“
11.05.18	eine außerordentliche Regionalkonferenz findet in Düsseldorf statt, dort wird im Protokoll festgehalten: <i>„Zur Vermeidung jährlich wiederkehrender Verteilungssitzungen von Schulformwechslern wird der Schulträger nochmals nachdrücklich und mit Zustimmung aller anwesenden Vertreter der Schulaufsicht aufgefordert, die Einrichtung einer weiteren Gesamtschule bei gleichzeitiger Reduzierung der Zügigkeit in den bestehenden Systemen (Realschule 1 Zug, Gymnasium 1 Zug, Gesamtschule Osterfeld 2 Züge) voranzutreiben. Diese wiederholt vorgetragene Maßnahme ist bereits mehrfach in der Regionalkonferenz diskutiert und im letzten Jahr mit allen Schulleitungen der weiterführenden Schulen vereinbart worden.“</i>
04.10.18	Die Schulverwaltung hat den Antrag der CDU Fraktion bzgl. der Einrichtung einer erweiterten Realschule ab Klasse sieben (Drucksache A/16/3997-01) der Bezirksregierung zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Mit Schreiben vom 04.10.2018 wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf mitgeteilt, dass die Neuerrichtung einer Aufbaurealschule weder von der Bezirksregierung noch vom Ministerium für Schule und Bildung (MSB) befürwortet wird. Es wurde darum gebeten eine andere schulorganisatorische Maßnahme zu prüfen und zeitnah umzusetzen
15.05.19	Eine erste differenzierte Analyse im Rahmen der anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung wird dem Schulausschuss vorgelegt (Drucksache M/16/4721-01). Die inhaltlichen Aufbereitungen werden insgesamt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Beschlossen wird, eine „Arbeitsgruppe Anlassbezogene Schulentwicklungsplanung“ unter Einbezug der Schulen, der Schulaufsicht sowie dem Oberbürgermeister einzurichten, um die Handlungsempfehlungen zu konkretisieren.
25.06.19	Die „Arbeitsgruppe anlassbezogene Schulentwicklungsplanung“ nimmt unter Teilnahme des Oberbürgermeister Herrn Daniel Schranz mit einer zweistündigen Sitzung im Elsa-Brändström-Gymnasium die Arbeit auf.
04.06.20	Drittes Treffen der „Arbeitsgruppe anlassbezogene Schulentwicklungsplanung“ am Hans-Böckler-Berufskolleg. Einzelmaßnahmen und Varianten wurden intensiv diskutiert und beraten. Die Teilnehmenden erklärten übereinstimmend ihre inhaltliche Präferenz für die Variante I . Plädiert wurde für eine umfassende und entschiedene Lösung. Detailfragen wären aber noch zu klären, insbesondere die baulichen Realisierungsbedingungen.
25.06.20	Es erfolgt die offizielle Schulträgerberatung durch das Dezernat 48 (Schulrecht und Schulverwaltung) der Bezirksregierung Düsseldorf. Die Schulverwaltung stellt die statistischen Entwicklungen, Überlegungen und Lösungsvorschläge vor. Auch die Vertreter*innen des Dezernats 48 unterstützen die seitens der Schulverwaltung und der „Arbeitsgruppe anlassbezogene Schulentwicklungsplanung“ erarbeiteten und präferierten Schulentwicklungsmaßnahmen (Variante I).



Bereich 3-3
Schule


STATISTISCHE BESTANDSAUFNAHME



- Oberhausener Bevölkerungsprognose: demografischer Aufschwung in den schulrelevanten Altersgruppen
- Mehr Schulaus- als Schuleinpendler*innen am Übergang Sek I
- Schulauspendler*innen häufig mit Empfehlungen für Realschule und Gymnasium
- Übergang zur Sek I: Übernachtfrage nach Realschul- und partiell nach Gesamtschulplätzen, Unternachfrage an Gymnasien
- Relativ ungünstige leistungsmäßige Durchmischung an den Gesamtschulen



Zusammensetzung an den Schulformen hinsichtlich der Schulformempfehlungen, gemittelte Werte (2015-2018)

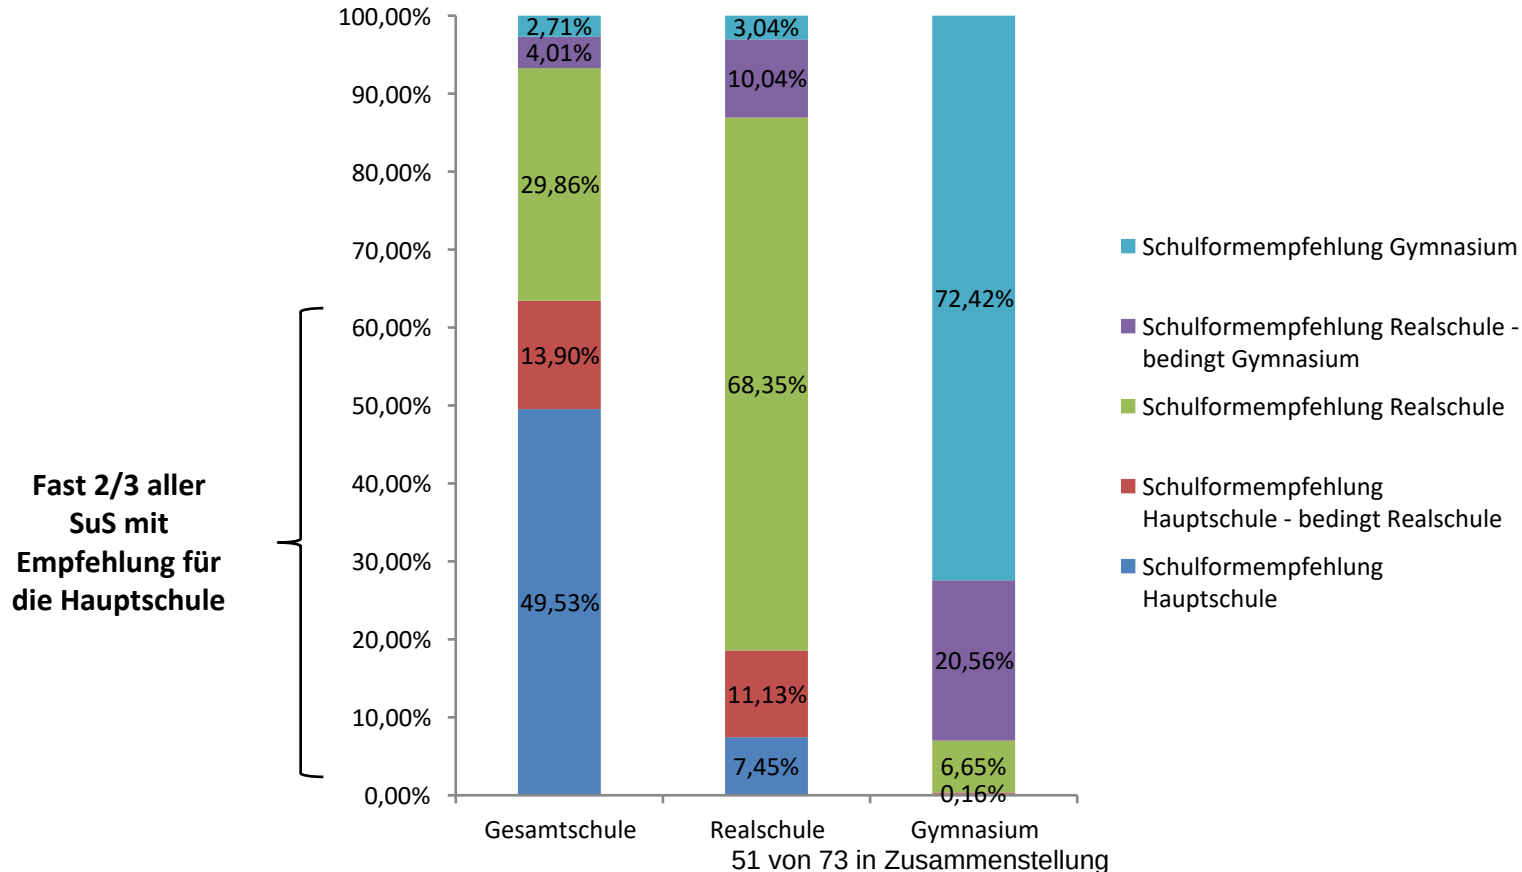



- Oberhausener Bevölkerungsprognose: demografischer Aufschwung in den schulrelevanten Altersgruppen
- Mehr Schulaus- als Schuleinpendler*innen am Übergang Sek I
- Schulauspendler*innen häufig mit Empfehlungen für Realschule und Gymnasium
- Übergang zur Sek I: Übernachtfrage nach Realschul- und partiell nach Gesamtschulplätzen, Unternachfrage an Gymnasien
- Relativ ungünstige leistungsmäßige Durchmischung an den Gesamtschulen
- Anstieg Schulformwechsler*innen → Probleme bei der Schullaufbahnsicherung (zusätzlich: Seiteneinsteiger*innen)



**Schulformwechsel nach abgebender Schulform im Verlauf der
Sekundarstufe I (7.Jgst. bis 9. Jgst.), absolut, Schuljahre 2015/2016 bis
2018/2019**

Abgebende Schulform	Jgst.	Schuljahr			
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Realschule	7	7	11	18	11
	8	1	0	6	4
	9	0	1	1	3
	Gesamt	8	12	25	18
Gymnasium	7	33	47	49	45
	8	2	10	12	13
	9	5	4	9	16
	Gesamt	40	61	70	74
Gesamt		48	73	95	92



Wiederholungen nach Schulform im Verlauf der Sekundarstufe I (7.Jgst. bis 9. Jgst.), absolut, Schuljahre 2016/2017 bis 2018/2019

Schulform	Jgst.	Schuljahr		
		2016/2017	2017/2018	2018/2019
Realschule	7	22	19	14
	8	17	21	30
	9	14	15	19
	Gesamt	53	55	63
Gymnasium	7	26	23	26
	8	31	42	36
	9	27	21	31
	Gesamt	84	86	93
Gesamt		137	141	156



- Oberhausener Bevölkerungsprognose: demografischer Aufschwung in den schulrelevanten Altersgruppen
- Mehr Schulaus- als Schuleinpendler*innen am Übergang Sek I
- Schulauspendler*innen häufig mit Empfehlungen für Realschule und Gymnasium
- Übergang zur Sek I: Übernachtfrage nach Realschul- und partiell nach Gesamtschulplätzen, Unternachfrage an Gymnasien
- Relativ ungünstige leistungsmäßige Durchmischung an den Gesamtschulen
- Anstieg Schulformwechsler*innen → Probleme bei der Schullaufbahnsicherung (zusätzlich: Seiteneinsteiger*innen)
- Anstieg an SuS mit diagnostizierten sonderpäd. Förderbedarf



Statistische Bestandsaufnahme

Bereich 3.3
Schule

**Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen
an den weiterführenden Schulen in Oberhausen,
Sekundarstufe I, 2014/15 bis 2019/20**

Schulform	Schulname	Schuljahr					
		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Realschule	Anne-Frank-Realschule	19	24	38	44	41	47
	Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	5	9	7	8
	Theodor-Heuss-Realschule	0	11	19	26	29	35
	Summe	19	35	62	79	77	90
Gesamtschule	Gesamtschule Osterfeld	21	37	69	76	80	92
	Heinrich-Böll-Gesamtschule	5	4	0	0	17	41
	Fasia-Jansen-Gesamtschule	10	20	29	37	47	60
	Gesamtschule Weierheide	0	0	0	0	0	0
	Summe	36	61	98	113	144	193
Gymnasium	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
	Heinrich-Heine-Gymnasium	0	0	0	6	11	11
	Elsa-Brändström-Gymnasium	6	12	21	29	32	25
	Sophie-Scholl-Gymnasium	0	0	0	12	10	9
	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	5	13	19	21	21	19
	Summe	11	25	40	68	74	64
Gesamt		66	121	200	260	295	347



Statistische Bestandsaufnahme

Bereich 3.3
Schule

Zusammenfassung

- Zukünftige Versorgungsengpässe auch in 5. Jgst.
- **Negative Durchlässigkeit + Seiteneinstiege + Inklusion**
→ sich verstärkende Versorgungsengpässe ab 7. Jgst.
- Lage an Realschulen (u.a.):
 - Aufnahme Schulformwechsel
 - Lehrer*innenmangel
 - Produziert selbst Wechsler + Klassenwiederholungen
- Lage an Gesamtschulen:
 - u.a. Leistungsmäßige Durchmischung
- Lage an Gymnasien:
 - u.a. Unterrichtsfrage am Übergang zur Sek I



SCHÜLER*INNENZAHLPROGNOSE

Argumentation zum Bedarf

Bereich 3-3
Schule

Derzeitige Kapazität je Jahrgang und Schulform

Schulformen und Einzelschulen	Anzahl der Züge	Kapazität je Jgst.*
Realschulen	14	378
Anne-Frank-Realschule	5	135
Friedrich-Ebert-Realschule	5	135
Theodor-Heuss-Realschule	4	108
Gesamtschulen	24	656
Gesamtschule Osterfeld	8	216
Heinrich-Böll-Gesamtschule	6	162
Fasia-Jansen-Gesamtschule	6	162
Gesamtschule Weierheide	4	116
Gymnasien	24	696
Elsa-Brandström-Gymnasium	5	145
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	5	145
Heinrich-Heine-Gymnasium	4	116
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	5	145
Sophie-Scholl-Gymnasium	5	145
Gesamt	62	1.730


*rechnerisch, wenn: Realschulen je 27 SuS/Klasse, IGS je 27 SuS/Klasse (außer Weierheide), Weierheide + Gymnasien je 29 SuS/ Klasse



Schüler*innenzahlprognose

Bereich 3-3
Schule

Jahresbezogene Schüler*innenzahlprognose für den Eingangsjahrgang der Sekundarstufe I (5. Jgst) im Vergleich zur aktuellen Gesamtkapazität, Schuljahre 2021/22 bis 2029/2030

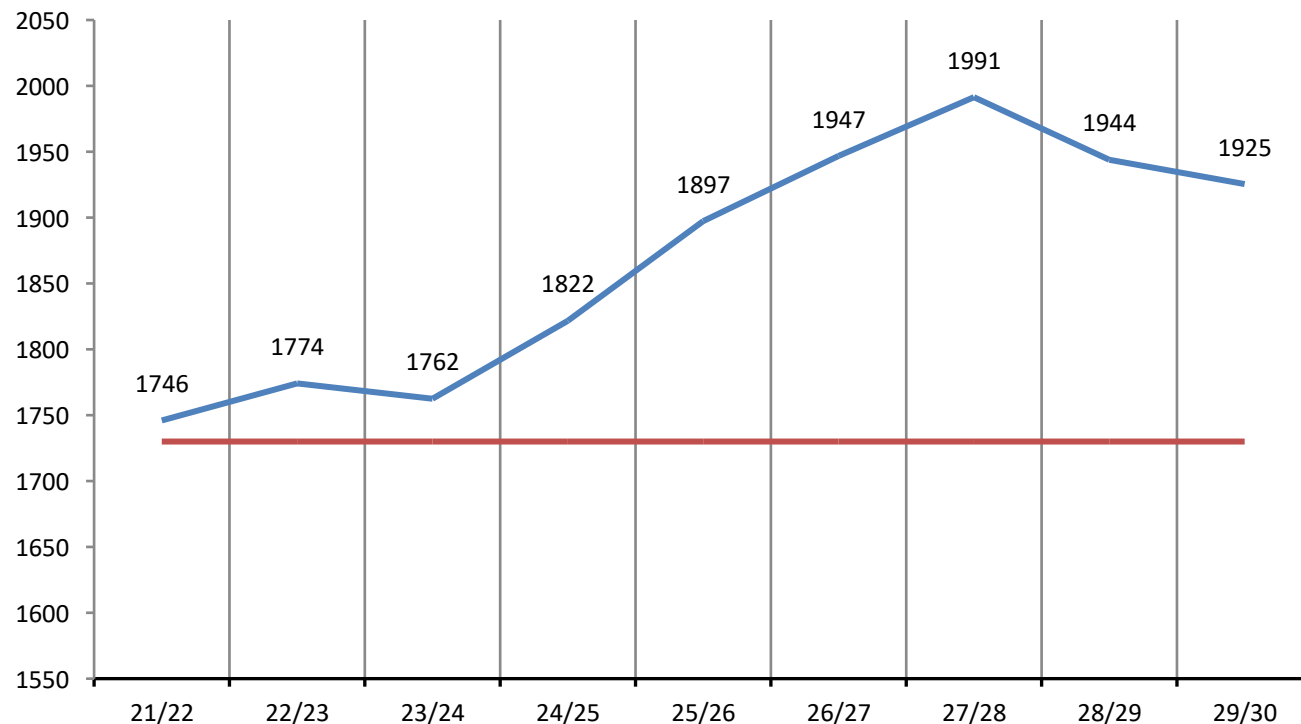

Geografische Bedarfsfeststellung

Ist-Stand der Verteilung

Schulformen	Raumbezug	Kapazität je Jgst.*	in % je Schulform
Realschule	Süd	135	35,71%
	Nord	243	64,29%
Integrierte Gesamtschule	Süd	162	24,70%
	Nord	494	75,30%
Gymnasium	Süd	406	58,33%
	Nord	290	41,67%
Summe	Süd	703	40,64%
	Nord	1027	59,36%

Prognose

Übergang weiterführende Schule	SuS-Prognose (je Jahrgang)	OB Süd - SuS absolut	OB Nord - SuS absolut	OB Süd - Anteil in %	OB Nord - Anteil in %
2029/2030	1925	917	1009	47,61%	52,39%
2028/2029	1944	918	1026	47,21%	52,79%
2027/2028	1991	944	1048	47,39%	52,61%
2026/2027	1947	898	1049	46,14%	53,86%
2025/2026	1897	892	1005	47,03%	52,97%
2024/2025	1822	881	941	48,35%	51,65%
2023/2024	1762	807	955	45,79%	54,21%
2022/2023	1774	811	963	45,71%	54,29%
2021/2022	1746	842	904	48,22%	51,78%



Argumentation zum Bedarf

Bereich 3-3
Schule

Schulformbezogene Bedarfsfeststellung

- Prämissen:

- Schulplatz in richtigem Ort und adäquater Qualität vorhalten
- SuS mit Hauptschulempfehlung Schulplatz bieten
- Leistungsmischung an Gesamtschulen verbessern
- **Durchlässigkeitsproblem bearbeiten**

...und für die Zukunft:

- Schullaufbahnen nach pädagogischen Bedürfnissen ermöglichen
- Reaktionsfähigkeit der Stadt erhalten



SCHULFORMBEZOGENE BEDARFSFESTSTELLUNG

Argumentation zum Bedarf

Bereich 3-3
Schule

Schulformbezogene Bedarfsfeststellung

**Prognose der Schüler*innen mit Hauptschulempfehlung je Übergangsjahr
(absolut) und Anteil an allen Gesamtschulplätzen des gegenwärtigen
Bestands (in %), bis 2029/2030**

Übergang weiterführende Schule	SuS gesamt (Eingangsjahrgang)	SuS mit HS- Empfehlung	SuS mit HS- Empfehlung an allen IGS-Plätze (Bestand), in %
2029/2030	1925	515	78,58%
2028/2029	1944	520	79,33%
2027/2028	1991	533	81,27%
2026/2027	1947	521	79,45%
2025/2026	1897	508	77,43%
2024/2025	1822	488	74,34%
2023/2024	1762	472	71,93%
2022/2023	1774	475	72,40%
2021/2022	1746	467	71,26%

Argumentation zum Bedarf

Bereich 3-3
Schule

Schulformbezogene Bedarfsfeststellung

**Schülergruppenspezifische Teilsummen und
Gesamtschüler*innenpotential je Eingangsjahrgang in der
Oberhausener Sekundarstufe I (5. Jgst.)**


Übergang weiterführende Schule	SuS mit HS- Empfehlung	30 % aller SuS mit Empfehlung für die Realschule	3,5 % aller SuS mit Empfehlung zum Gymnasium	Summe Gesamtschüler*innen- potential
2029/2030	515	578	67	1161
2028/2029	520	583	68	1172
2027/2028	533	597	70	1200
2026/2027	521	584	68	1173
2025/2026	508	569	66	1144
2024/2025	488	546	64	1098
2023/2024	472	529	62	1062
2022/2023	475	532	62	1069
2021/2022	467	524	61	1052



VARIANTEN DER UMSETZUNG




Variante I

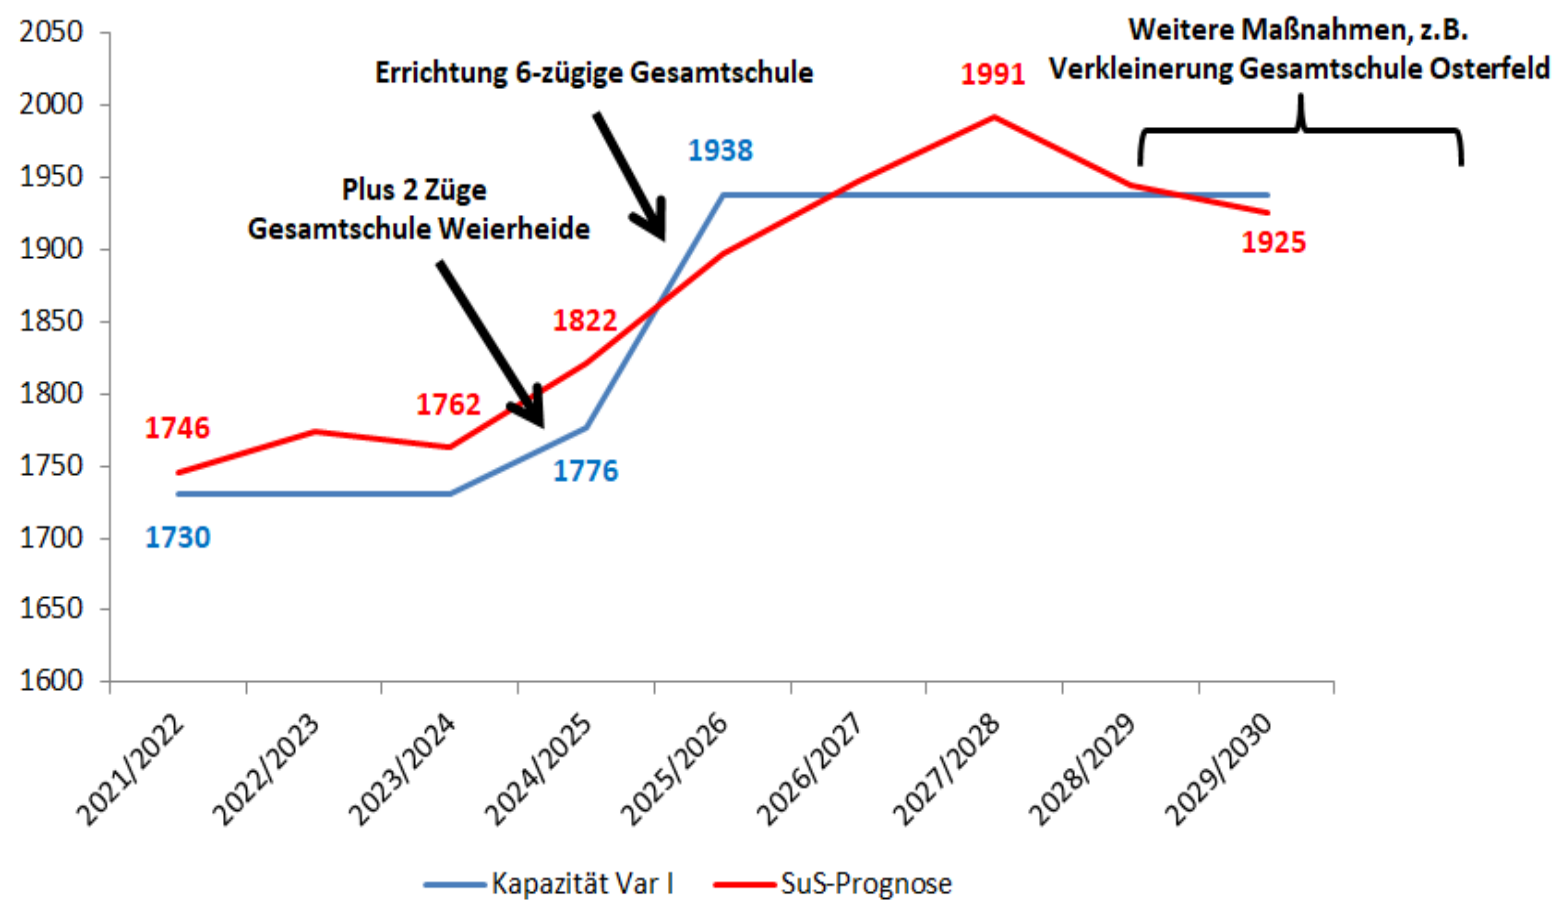




Variante II

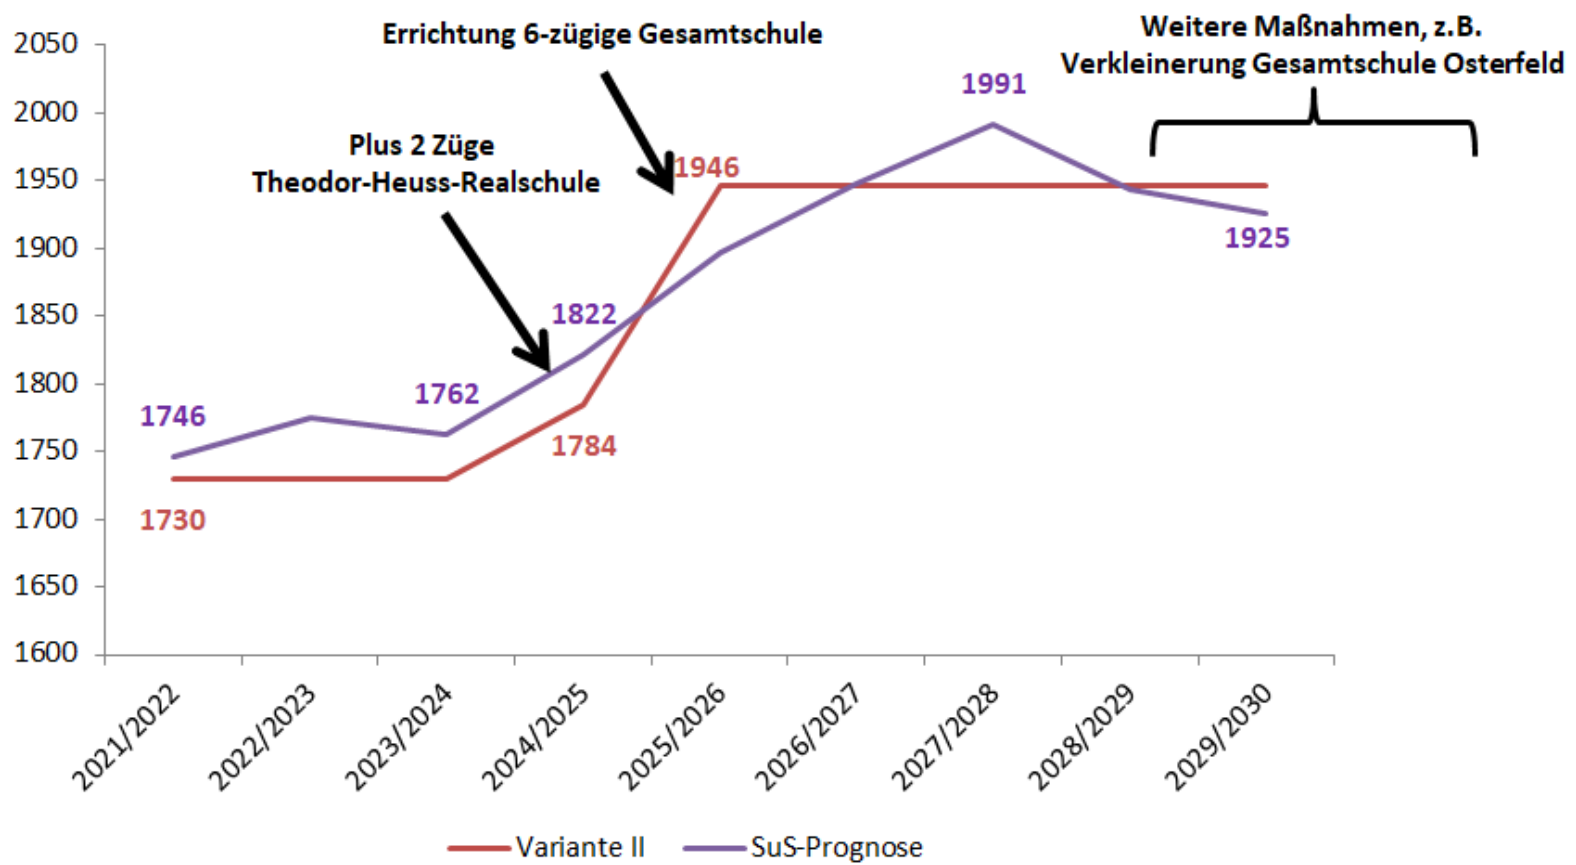



Variante III

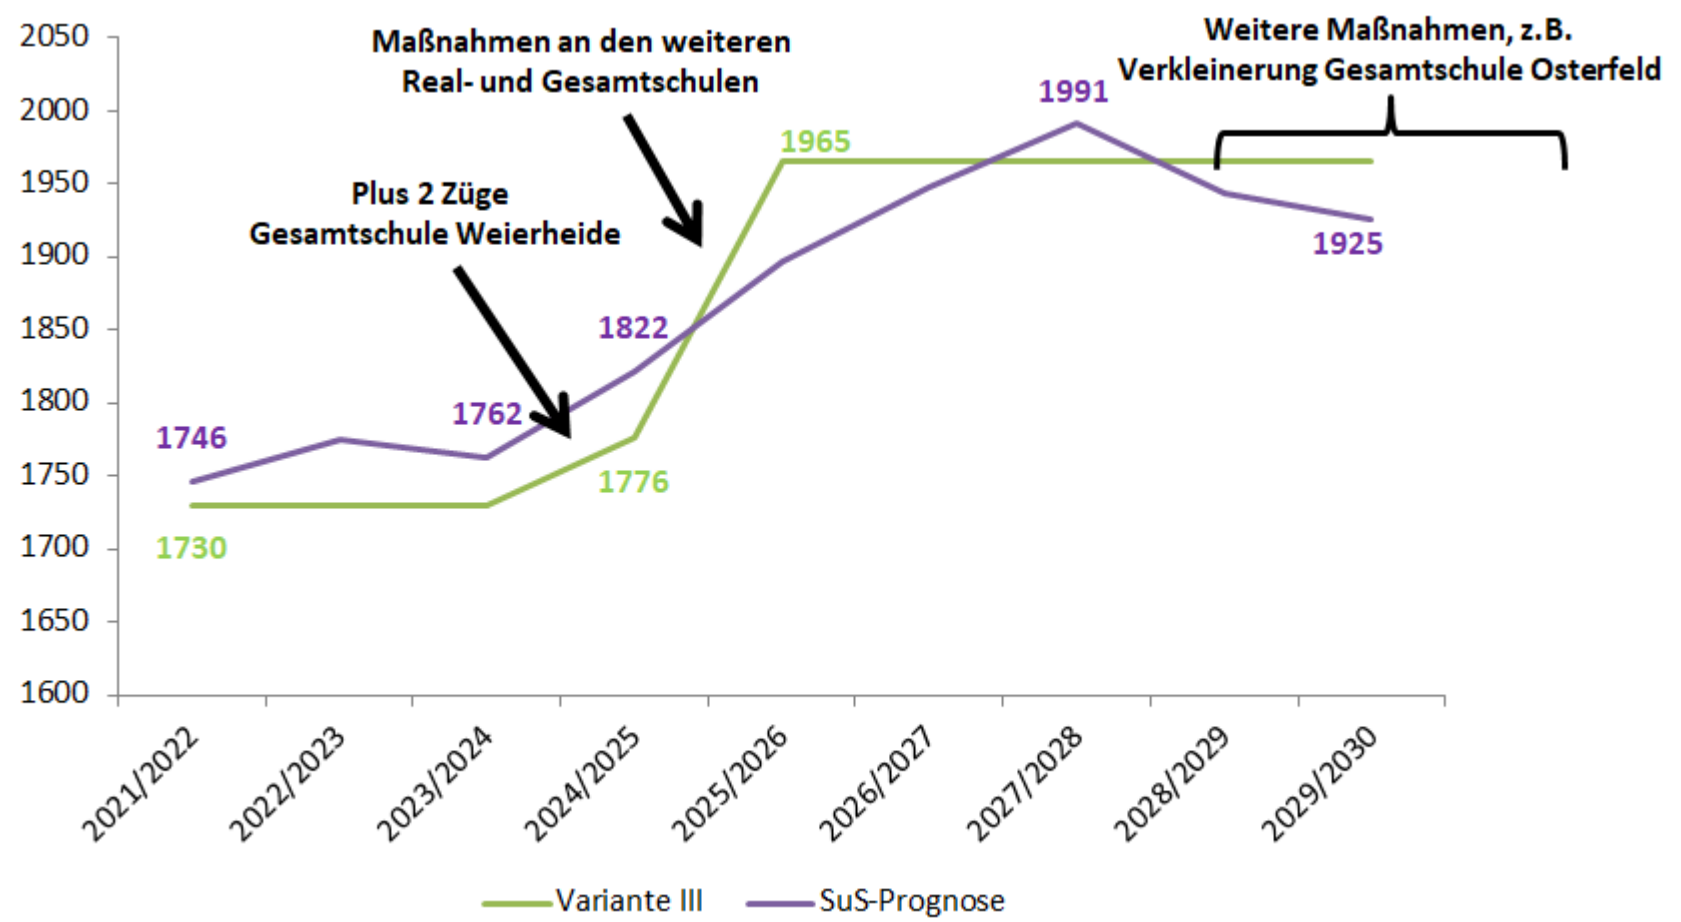



Schulorganisatorische Maßnahmen

Kostenannahmen

- Neue IGS an ehem. St. Michael: ca. 55.780.000 € (brutte) + Schulausstattung (3,8 Mio.) + Außenanlage (1,4 Mio.) → ca. 61 Mio. €
- Weierheide: insgesamt ca. 25 Mio. €
- Theodor-Heuss-Realschule: ca. 10 Mio. €



EMPFEHLUNG DER VERWALTUNG



Die Zusammenschau aller Gesichtspunkte und Argumente lässt die Schulverwaltung der Stadt Oberhausen zur Schlussfolgerung gelangen, dass die **Umsetzung der in Variante I** benannten schulorganisatorischen Maßnahmen die Schulentwicklung in Oberhausen in vorteilhafter Weise unterstützen würde.

Daher empfiehlt die Schulverwaltung der Stadt Oberhausen:

- Die Neuerrichtung einer 6-zügigen Integrierten Gesamtschule am Standort der ehemaligen Hauptschule St. Michael in Alt-Oberhausen,
- eine Erweiterung an der Gesamtschule Weierheide um zwei Züge zu einer dann 6-zügigen Integrierten Gesamtschule.



Bereich 3-3
Schule

Herzlichen Dank!

bjoern.hermstein@oberhausen.de
