Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. M/15/2866-01	Termin 03.07.2013	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen
Bericht / Mitteilung			öffentlich

Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss-kontrolle*
03.07.2013	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	K		

Berichtsgegenstand

Kanalbauprogramm 2005
Kanalerneuerung Bonmann-/Margaretenstraße einschließlich Katharinenstraße
Erneuerung der Verkehrsflächen Bonmann- und Margaretenstraße

Sachdarstellung

Im Kanalbauprogramm 2005 wurde beschlossen, dass der Kanal im Bereich der Bonmann- und Margaretenstraße aus hydraulischen Gründen erneuert werden muss.

In der Bezirksvertretungssitzung vom 13.06.2012 war u. a. die Kanalbaumaßnahme Bonmann-/Margaretenstraße Teil eines Sachstandsberichts über Baustellen im Stadtgebiet von Oberhausen.

Im Februar 2012 wurden die dortigen Straßenbäume im Bereich der dort geplanten Versorgungsleitungen gefällt. Nach Verlegung der Leitungen innerhalb des Straßenraumes der Margareten- und Bonmannstraße wurde mit der Kanalsanierung begonnen.

Daran anschließend (Ende 2013/Anfang 2014) wird die Erneuerung der Verkehrsflächen durchgeführt. Der Querschnitt der Straße wird wie folgt aufgeteilt. Die Fahrbahn wird von 6,00 m auf 5,50 m eingeengt. Die Breite der Parkbuchten wird von ca. 2,40 m auf 2 m zugunsten einer Verbreiterung des Gehwegs (> 2,00 m) reduziert. Östlich des Pumpwerks werden die Nebenanlagen an den Bestand angepasst.

Die provisorisch für den Bau des Pumpwerks hergestellte Baustraße wird im Zuge der Tiefbauarbeiten wieder zurückgebaut.

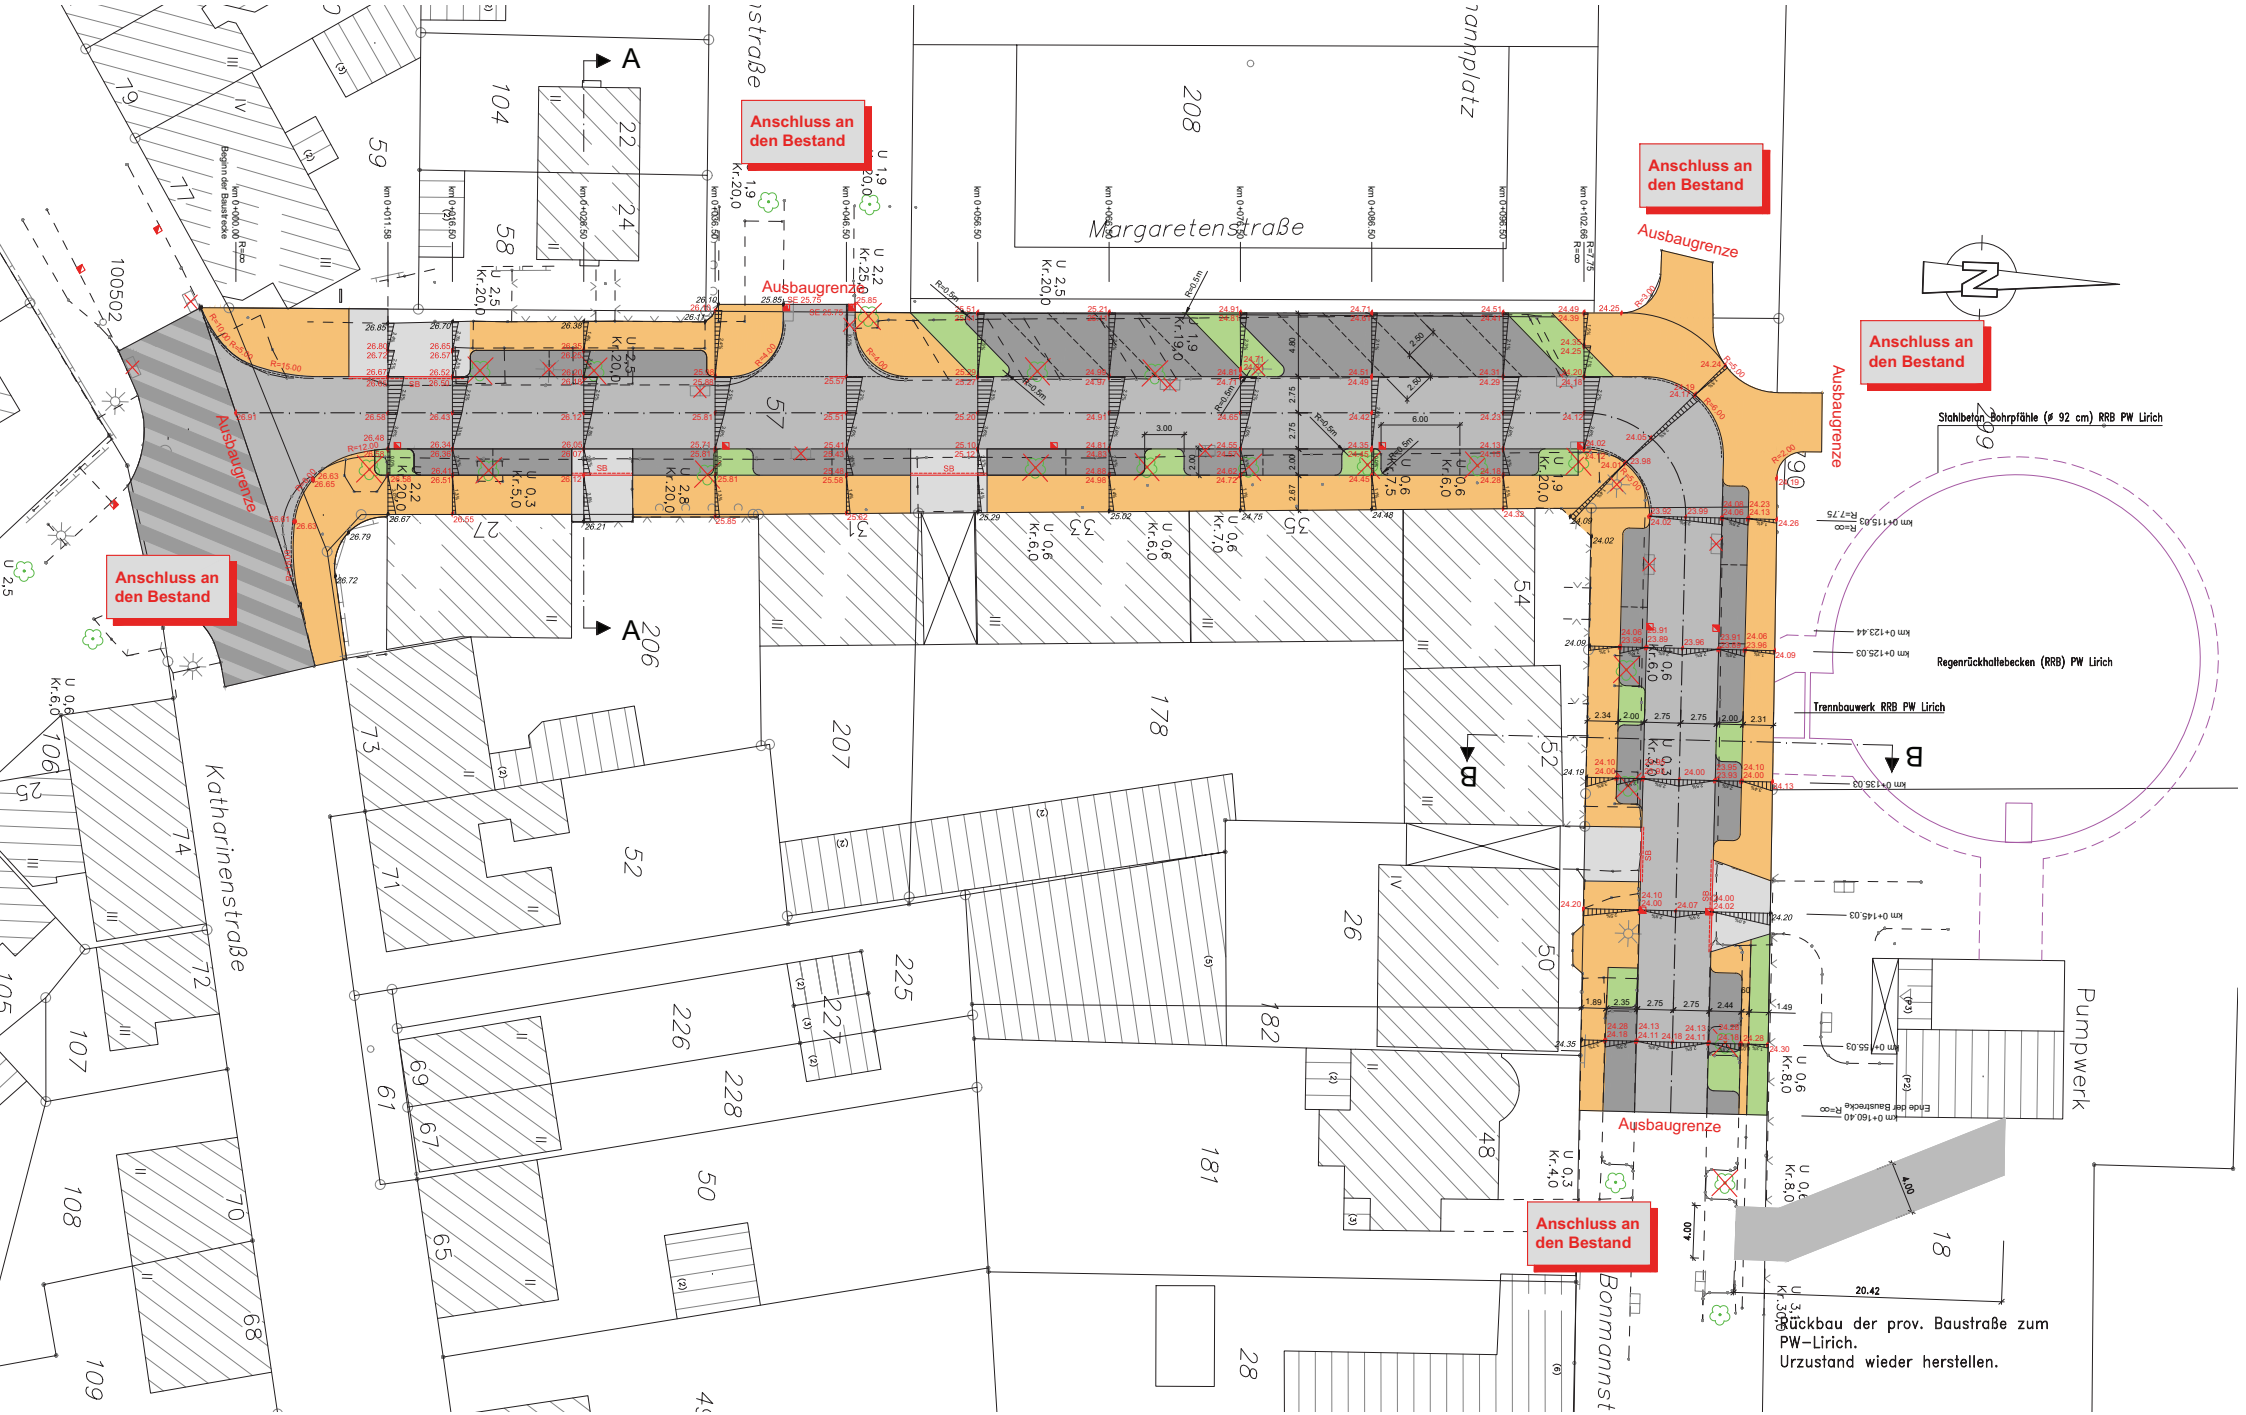
stellv. Bereichsleiterin Bereich 5-6/Tiefbau	Dezernat 5 Planen, Bauen	Kämmerer	Oberbürgermeister
Janclas 14.06.2013	Motschull i. V. 18.06.2013	Datum	Datum

* Vorlage zur:	* Ergebnis :	Beteiligung:
Kenntnisnahme (K)	Kenntnisnahme (K)	Personalrat [ ] Gleichstellungsstelle [ ]

Die Kosten für den Ausbau der Margareten- und der Bonmannstraße (ab der Karolinenstraße bis zur Margaretenstraße einschließlich des bereits fertig gestellten Abschnitts von der Karolinenstraße bis zum Pumpwerk) werden nach KAG abgerechnet.

Anlage

Lageplan Straßenbauentwurf


Anschluss an den Bestand
Anschluss an den Bestand
Anschluss an den Bestand
Anschluss an den Bestand
Ausbaugrenze
Ausbaugrenze
Ausbaugrenze
Ausbaugrenze
Margaretenstraße
Katharinenstraße
Bonmannstr
Stahlbeton-Bohrpfähle (ø 92 cm) RRB PW Lirich
Regenrückhaltebecken (RRB) PW Lirich
Trennbauwerk RRB PW Lirich
Pumpwerk
Rückbau der prov. Baustraße zum PW-Lirich.
Urzustand wieder herstellen.
