

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
16.06.2021	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	A			
17.06.2021	Schulausschuss	V			
21.06.2021	Haupt- und Finanzausschuss	V			
28.06.2021	Rat der Stadt	B			

Beratungsgegenstand

Errichtung eines Anbaus an der Astrid-Lindgren-Schule im Rahmen der Umsetzung des zweiten Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG II)

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die Errichtung eines Anbaus an der Astrid-Lindgren-Schule mit einem förderfähigen Baukostenvolumen in Höhe von voraussichtlich rund 5.226.000,00 EUR im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel 2 (KInvFöG II) sowie des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW vorbehaltlich der Bestätigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf zzgl. der Honorarkosten für Planungen und Gutachten in Höhe von rund 1.000.000,00 EUR.

Finanzielle Mittel stehen hierfür in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 unter der Finanzstelle 330003010100501 (KIF II Astrid-Lindgren-Schule), Finanzposition 785100 (AiB Hochbaumaßnahmen), 785120 (AiB Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen) sowie Finanzposition 681003 (Investitionszuweisungen vom Bund – KIF) wie folgt zur Verfügung:

2021	2022	2023
1.150.000 EUR	4.370.000 EUR	1.012.500 EUR

SBO Servicebetriebe Oberhausen	Bereichsleiterin Bereich 3-3 Schule	Beigeordneter Dezernat 3
A. Kußel 07.06.2021	Dr. U. Jordan-Ecker 08.06.2021	J. Schmidt 08.06.2021
Beigeordneter Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
M. Jehn 08.06.2021	A. Tsalastras 10.06.2021	D. Schranz 10.06.2021
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Eine Anpassung gemäß der aktuellen Kostenberechnung erfolgt im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2022 ff.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

Drucksache Nr. B/16/1642-01: „Bildungsplan 2016-2020“

Drucksache Nr. B/16/2698-01: „Durchführung des Finanzierungsprogrammes Gute Schule 2020; hier: geplante Maßnahmen“

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN und FDP im Rat zur Vorlage
Nr. B/16/2698-01: „Durchführung des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“
hier: geplante Maßnahmen“

Drucksache-Nr. B/16/3976-01: „Umsetzung des Finanzierungsprogrammes ‚Gute Schule 2020‘; hier: Detailplanungen und Kosten an 5 Schulen des Beschlusspunktes ‚Umbau Mensen‘“

Drucksache-Nr.: B/16/4160-01: „Maßnahmenplanung Erweiterung Offene Ganztagsbereiche und Mensen an Schulen im Rahmen der Umsetzung des zweiten Kapitels des „Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes in Nordrhein-Westfalen“ (KInvFöG II) und „Gute Schule 2020“

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Die Stadt Oberhausen erhält im Rahmen des Förderprogrammes Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz des Bundes (KInvFG) Artikel 7 des Gesetzes vom 14. August 2017 (Ergänzung um Kapitel 2), und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes in Nordrhein-Westfalen vom 08.01.2018, 20.560.701,00 EUR für das Kapitel 2 (KInvFöG NRW II). Zuzüglich der zu erbringenden Eigenmittel von mindestens 10 % stehen für Investitionsmaßnahmen **rd. 22,845 Mio. EUR** bis 30.06.2024 zur Verfügung.

Ausgangslage

Mit der Vorlage Drucksache-Nr. B/16/3976-01: „Umsetzung des Finanzierungsprogrammes ‚Gute Schule 2020‘; hier: Detailplanungen und Kosten an 5 Schulen des Beschlusspunktes ‚Umbau Mensen‘“ wurde in der Ratssitzung vom 24.09.2018 der aufgrund hygiene- und lebensmittelrechtlicher Anforderungen zwingend notwendige Umbau der Mensen an den Grundschulen dargestellt. Um den Offenen Ganzttag weiterhin an allen Grundschulen sicherzustellen, ist ein Umbau der Mensen an allen Grundschulstandorten verpflichtend vorzunehmen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

54 Der Offene Ganztagsbereich der 4-zügigen Astrid-Lindgren-Schule (ALS) befindet sich in einem separaten Gebäude auf der Dieckerstraße - genannt Villa Wunderbar. Der Ganztagsbereich ist ca. 200 m
55 von der Schule entfernt. Die Kinder verlassen somit das Schulgelände, überqueren die Dieckerstraße
56 und gehen eigenständig zur Villa Wunderbar.
57

58
59 In der Begleitvorlage der Verwaltung zum Bildungsplan 2016 bis 2020 wurde herausgearbeitet, dass im
60 Ganztagsbereich der Astrid-Lindgren-Schule ein dringender Handlungsbedarf besteht. Der Essraum ist
61 zu klein, während die Anzahl der reinen Ganztagsräume die Anforderungen der Raumleitlinie übertrifft.
62 Ungeprüft blieb hierbei die tatsächliche Größe der Räume.
63

64 Die Essensausgabe befindet sich zurzeit in einem 50 qm großen Raum inklusive Ausgabeküche und
65 Speisebereich. Baulich ist die Erweiterung der Mensa im Bestand nicht umsetzbar. Ein Neu- bzw.
66 Anbau ist unumgänglich.
67

68 In der Villa Wunderbar stehen dem Ganztagsbetrieb 8 Betreuungsräume, Tornisterräume im Keller,
69 1 Büro, 1 Küche und Toiletten zur Verfügung. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass nur ein Gruppen-
70 raum eine Größe von beinahe 50 qm erreicht, während die restlichen Betreuungsräume nur eine Größe
71 zwischen 12 und 20 qm aufweisen. Dies entspricht einer Gesamtnutzfläche von rd. 170 qm.
72

73 Eine 4-zügige Schule benötigt laut Bildungsplan und Schulbauleitlinie je Zug einen Gruppenraum mit
74 einer Größe von rund 72 qm, was einer Fläche von ca. 288 qm für Gruppenräume entspricht.
75

76 Die weiteren Flächen, die im Bildungsplan als „sonstige Räume“ angegeben sind, finden hier aufgrund
77 der örtlichen Trennung nur eingeschränkt Berücksichtigung. Unter „sonstige Räume“ sind die Räume
78 aufgeführt, die eine Doppelfunktion sowohl für den Unterricht, als auch für den Ganztagsbetrieb ermög-
79 lichen (beispielsweise Bücherei, Kunst- und Mehrzweckräume).
80

81 82 **Schulentwicklung** 83

84 Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine vierzügige Grundschule, die aufgrund der steigenden
85 Schüler*innenzahl durchgängig prognostiziert wird.
86

87 Die Statistiken zur Ganztagsituation an der Astrid-Lindgren-Schule zeigen einen zwischen den Schul-
88 jahren 2017/2018 und 2019/2020 stabilen Bedarf an Ganztagsplätzen in einer Größenordnung von ca.
89 220 bis 230 Plätzen. Laut einer Abfrage bei der Schule aus dem März 2020 wird für die kommenden
90 Schuljahre von einem Bedarfsanstieg auf bis zu 260 Ganztagsplätze ausgegangen. Entsprechend ist
91 für die kommenden Jahre bei Fortsetzung des Trends von erhöhten Ganztagsplatzbedarfen auszu-
92 gehen. Die weitere reale Entwicklung der Platznachfrage ist fortlaufend zu beobachten.
93

Astrid-Lindgren-Schule	Schuljahr 2016/2017	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022**
Halbtagsunterricht	146	131	155	157	135	122
Teilnahme am offenen Ganztag	188	224	231	220	248	260
Summe SuS	334	355	386	377	383	382

* Prognosewert für Summe SuS und Meldewert für die Ganztangsteilnahme

** aus den Vorjahreswerten abgeleitete Prognosewerte

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bei dem Ausbau der Küchen und der Mensa geht der Bereich Schule von einer 100 %-Teilnahme aller Schüler/Schülerinnen aus.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Bundesregierung beabsichtigt, ab dem Jahr 2025 einen Rechtsanspruch auf einen OGS Platz gesetzlich zu regeln.

Geprüfte Lösungsvarianten

Um die Ganztagsituation zu verbessern, sind in einem **ersten Entwurf** aus dem Jahr 2017 drei Möglichkeiten (vgl. Anlage 1) erarbeitet worden. Von 2019 bis 2021 sind die Planungen intensiviert und an den Raumbüchern entsprechend der vom Rat beschlossenen Schulbauleitlinie angepasst worden.

Die bisherigen Entwürfe beschrieben folgende Bauvarianten:

1) Eingeschossiger Anbau Villa

Auf der Fläche der derzeitigen Terrasse könnte ein ebenerdiger Anbau mit einer BGF von 240m² erfolgen. Darüber hinaus ist ein größerer Anbau aus baurechtlichen Gründen ausgeschlossen.

Durch diesen Anbau kann eine Mensa geschaffen werden. Allerdings würde der Zugang zur Außenanlage durch den Speiseraum erfolgen. Wegen des fehlenden Tageslichts müsste eine Umnutzung der Räume erfolgen.

Der Anbau würde zudem direkt vor den Fenstern eines Gruppenraumes von 16 qm, dem Büro und der Personaltoilette errichtet werden, was zu einer Umnutzung dieser Räume wegen fehlendem Tageslicht führt.

Die beauftragte Architektin nahm Kosten in Höhe von rund 865.000 EUR an.

Da die gültigen Raumleitlinien hierdurch nicht erfüllt werden, wurde diese Variante verworfen.

2) Unterkellierter Anbau Villa

Der Anbau an der Villa könnte erweitert werden, wenn dieser zusätzlich unterkellert wird.

Damit die Lüftung und Belichtung nutzungsgerecht ist, müsste am unterkellerten Anbau abgeböschert werden. Im Souterrain könnte eine Mensa errichtet werden, die den Anforderungen nicht in Gänze entspricht.

Neben einer Mensa könnten zusätzlich im Erdgeschoss zwei Gruppenräume und ein Büro errichtet werden.

Damit wären zumindest die Flächen-Anforderungen an Gruppenräumen erfüllt. Eine Doppelnutzung der „sonstigen Räume“ und damit auch eine Nutzung der Schule im Nachmittagsbereich für eine kreative und breit aufgestellte Betreuung ist weiterhin aufgrund der räumlichen Trennung von Schule und Ganztags nur eingeschränkt möglich.

Die beauftragte Architektin nimmt Kosten in Höhe von rund 2.440.000 EUR an. Dieser hohe Kostenaufwand ist bedingt durch die technisch anspruchsvolle Aufgabe, das Bestandsgebäude nach der Ausschachtung für den Anbau abzufangen. Zudem sind in Teilen die Brüstungshöhen der Villa Wunderbar zu ändern. Die Investitionshöhe spiegelt die erschaffenen Mehrwerte nicht wider und ist hiermit als unverhältnismäßig teuer einzustufen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

3) Anbau an der Schule

Um die Ganztagsituation zu verbessern und zur Erfüllung funktionaler und schulischer Anforderungen, kann der Ganzttag von der Villa auf das Schulgelände verlagert werden. Dies führt dazu, dass eine Mensa, vier Gruppenräume, ein Tornisterlager und ein OGS-Leitungsbüro benötigt werden.

Da der Schulhof keine geeignete Fläche bietet, ist ein Anbau am Bestandsgebäude auf dem städtischen Bolzplatz unter Beibehaltung des restlichen Spielplatzes denkbar. Der Kinderspielplatz ist eine öffentliche Fläche, die durch die Schule in den Pausen als sog. Zweiter Schulhof stark frequentiert wird.

Gemäß der getroffenen verwaltungsinternen Festlegung sind im Zuge von Anbauten die Schulbauleitlinien insgesamt zu überprüfen. Diese Überprüfung erbrachte nachfolgendes Ergebnis:

Raum	Leitlinie	Bestand	Fehlbedarf	Begründung
Klassenraum (72qm)	16	15	1	Eine durchgängige Vierzügigkeit kann nur zu Lasten eines Mehrzweckraumes erfolgen.
Differenzierung (30 – 36qm)	288 qm	30qm	258	Zumindest ein Differenzierungsraum (halbe Klassenraumgröße) je Jahrgang sollten vorgehalten werden.
Mehrzweckraum (72qm)	4	2	2	Fachräume zur freien pädagogischen Verwendung in Klassenraumgröße benötigen die Schulen zur Unterstützung ihrer Konzepte.
Aula	1	0	1	
Bücherei (72qm)	1	0	1	Die Bücherei ist im Lehrerzimmer aufgrund der räumlichen Enge untergebracht.
Besprechungs-/ Streitschlichterraum	2	0	2	

Bei der vorgenannten Überprüfung der Schule fiel zudem auf, dass der sog. Neubau (Baujahr 1995) auf dem Schulhofgelände mit fünf Klassenräumen nicht mehr den heutigen pädagogischen Anforderungen entspricht. Die Klassenräume haben nur eine Größe von rund 56m². Allerdings entspricht die Gesamtfläche den Schulbauleitlinien für den Ganztagsbereich. In dieses Gebäude können die Gruppenräume und das OGS-Leitungsbüro verlagert werden. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die fünf Klassenräume in einem Anbau an der Schule ersetzt werden müssen.

Mittels eines Anbaus (vgl. Anlage) auf dem Bolzplatz kann ein Großteil des erheblichen Raumbedarfes geschaffen werden. Mit Blick auf das zur Verfügung stehende Baufeld und die bau- und planungsrechtlichen Vorgaben mussten die fehlende Aula und die Minderflächen bei den Differenzierungsräumen nachrangig beurteilt werden.

Unter diesen Voraussetzungen können im Erdgeschoss die Mensa, ein Klassenraum und Differenzierungs- oder Tornisterraum – je nach schulischer Organisation – errichtet werden. Hierbei ist auch zu beachten, dass der Anbau an das Bestandsgebäude mit einem Übergang ausgestattet wird, um diesen im Schulkomplex zu integrieren.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Im ersten Obergeschoss sollen drei Klassenräume und zwei Differenzierungsräume entstehen. Auch hier gibt es einen Übergang zum Bestandsgebäude. Durch den ebenerdigen Zugang und dem integrierten Aufzug werden damit auch weitere Klassenräume und die Verwaltung der Astrid-Lindgren barrierefrei zugänglich.

Im Obergeschoss werden die fehlenden Klassenräume, ein Mehrzweckraum und eine Bücherei errichtet.

Die Planung wurde mit der Schul- und OGS-Leitung abgestimmt.

Die Planungen sind so weit fortgeschritten, dass eine Kostenberechnung vorliegt. Bei Kostenberechnungen sind Abweichungen von nur noch +/- 10% zu kalkulieren. Die Baukosten für den Umbau des Ganztagsgebäudes und der Erweiterung der Schule betragen rund 5.226.000 EUR. Hinzu kommen noch Honorarkosten von rund 1.000.000 EUR. Dem gegenüber steht eine 90%ige Förderung der Baukosten in Höhe von rund 4.700.000 EUR.

Abwägung der Varianten

Ablehnung Variante 1

Die Variante 1 (eingeschossiger Anbau an der Villa) wurde verworfen, da die Raumleitlinie für den Ganztagsbereich entsprechend des Bildungsplanes nicht erfüllt wird.

Ablehnung Variante 2

Die Variante 2 (unterkellierter Anbau an der Villa) ist offensichtlich kostengünstiger, jedoch relativiert sich dieser erste große Kostenunterschied.

Wie bereits oben festgestellt kann bei diesem Anbau die Raumleitlinie der OGS-Betreuungsflächen eingehalten werden. Die Schule hingegen hat weiterhin einen erheblichen räumlichen Engpass, zumal ein zusätzlicher Klassenraum für die durchgängige Vierzügigkeit zwingend erforderlich ist. Dies bedeutet, dass kurz- bis mittelfristig ein weiterer Anbau an der Schule errichtet werden muss. Die ermittelten Bedarfe (Bücherei, Differenzierungsräume etc...) müssten dann ebenfalls entsprechend der Schulbauleitlinie erfüllt werden. Somit müssten zwei Baumaßnahmen sowohl an der Villa als auch an der Schule erfolgen. Diese Kosten wurden durch das Architekturbüro auf 3.600.000 EUR geschätzt.

Folglich ist mit einem Investitionsbudget von rund 6.000.000 EUR zu kalkulieren. Die Kostenersparnis liegt hiermit nur noch bei 226.000 EUR.

Weiterhin ist zu beachten, dass während der Bauphase an der Villa die Nutzung nur erheblich eingeschränkt bis gar nicht möglich sein wird. Eine Lösung ist zum jetzigen Zeitpunkt der Planung nicht erarbeitet worden. Weitere Kosten für eine Übergangslösung sind nicht ausgeschlossen.

Das Pendeln der Schüler*innen zwischen Ganztagsgebäude und Hauptstandort durch den Straßenverkehr würden erhalten bleiben ebenso wie die eingeschränkte Nutzung der „sonstigen Räume“ in der Schule.

Vorschlag Variante 3

Die Verwaltung empfiehlt die Umsetzung der Variante 3 zur Erfüllung funktionaler und schulischer Anforderungen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0774-01	Termin 28.06.2021	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

234

235 Durch den Anbau an der Schule werden die Schulbauleitlinien annähernd erfüllt mit Ausnahme der
236 Aula. Als Ersatz kann allerdings die 110 m² große Mensa genutzt werden. Der Standort ist durch die
237 Aufwertung auch bei den prognostizierten steigenden Schüler*innenzahl zukunftsfähig. Da der Anbau
238 den neuesten technischen Standard beinhalten wird, ist dieser Anbau auch energetisch und bei den
239 laufenden Betriebskosten wirtschaftlicher als die Villa Wunderbar. Zudem ist ein Gründach vorgesehen.
240 Die Installation einer Photovoltaikanlage kann zusätzlich geprüft werden.

241

242 Wie oben bereits dargestellt erfährt der gesamte Standort eine Aufwertung in der inklusiven Ausge-
243 staltung. Bisher nicht erreichbare Räume werden ebenfalls barrierefrei nutzbar. Durch die Verlagerung
244 des Ganztages müssen Erstklässler das Schulgelände nicht mehr verlassen, um zum Ganztagsbereich
245 zu gelangen. Ebenso ist hierdurch eine Nutzung der „sonstigen Räume“ ermöglicht.

246

247 Durch den Freizug werden eine Nachfolgenutzung oder auch Vermarktung der Villa Wunderbar
248 möglich. Diesbezüglich ist zu beachten, dass bauseitige Fördermittel für den Ankauf und Umbau zum
249 Ganztags zweckgebunden gewährt wurden. Die Restmittel betragen rund 100.000 EUR. Eine anteilige
250 Erstattung ist abhängig von der Nachfolgenutzung.

251

252

253 **Thema Spiel- und Bolzplatz**

254

255 Der Anbau soll auf dem heutigen Bolzplatz entstehen. Der restliche Spielplatz kann aber erhalten
256 bleiben. Auf alternative Flächen für einen Bolzplatz kann die Stadt Oberhausen aktuell nicht zurück-
257 greifen. Die Verwaltung bemüht sich aber, im Quartier nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und soll
258 bei städtebaulichen Maßnahmen den Bedarf berücksichtigen.

259

260

261 **Ausblick und Sachstand KInvFöG II**

262

263 Das Förderprogramm soll priorisiert für den Ausbau des Offenen Ganztags an Grundschulen genutzt
264 werden. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass trotz der hohen Investitionssumme alle weiteren
265 Grundschulen noch mit einer hygienegerechten Mensa ausgestattet werden können. Ein Sachstand ist
266 in Anlage 2 dargestellt.

267


268

269 **Anlagen**

270 1) Grundrisspläne Anbau Varianten 1 – 3

271 2) Maßnahmeplanung

Übersicht Lage

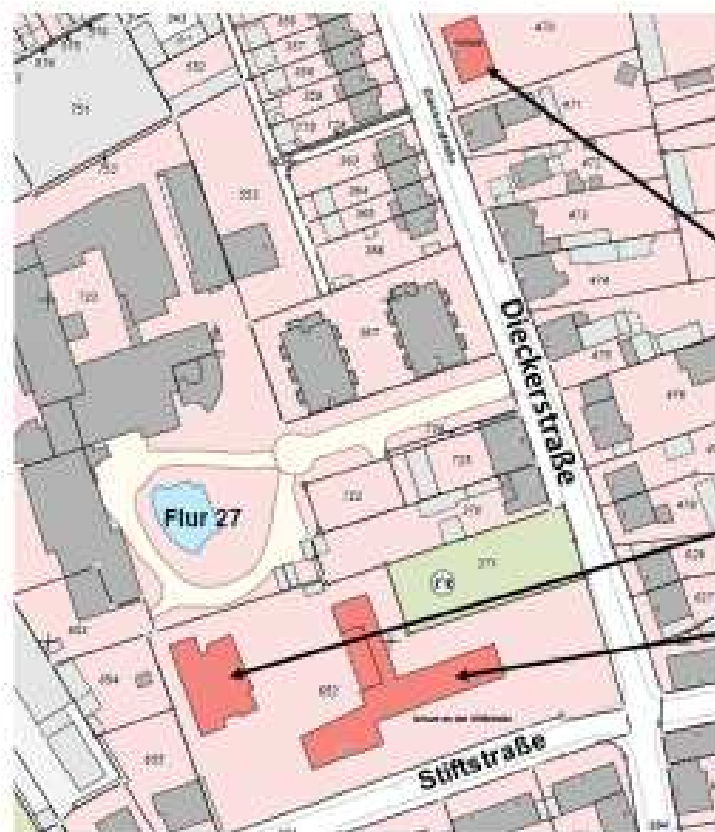

Astrid Lindgren Schule

Gebäudebestand der vierzügigen Grundschule

OGS-Gebäude


Erweiterungsgebäude

Altgebäude

Variante 1




Variante 2

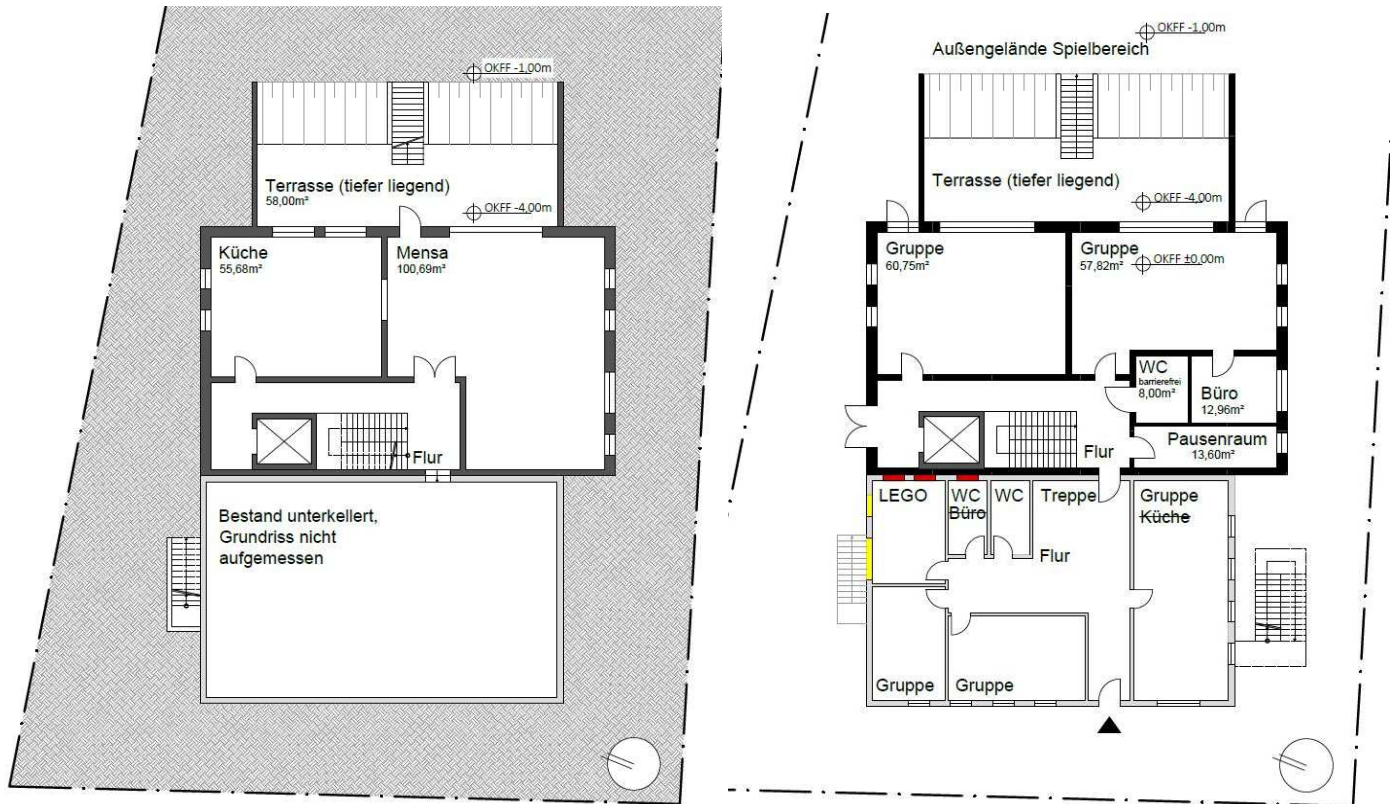


Variante 3

Umbau Bestand „Erweiterungsgebäude“

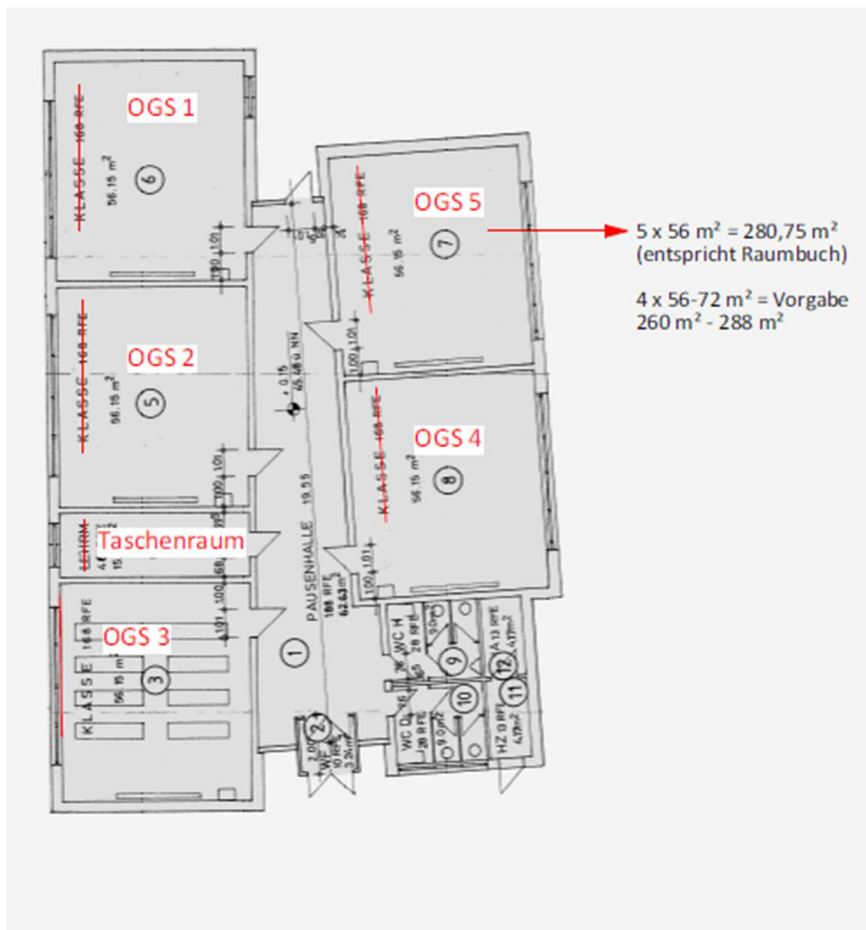


Anbau


Erdgeschoss

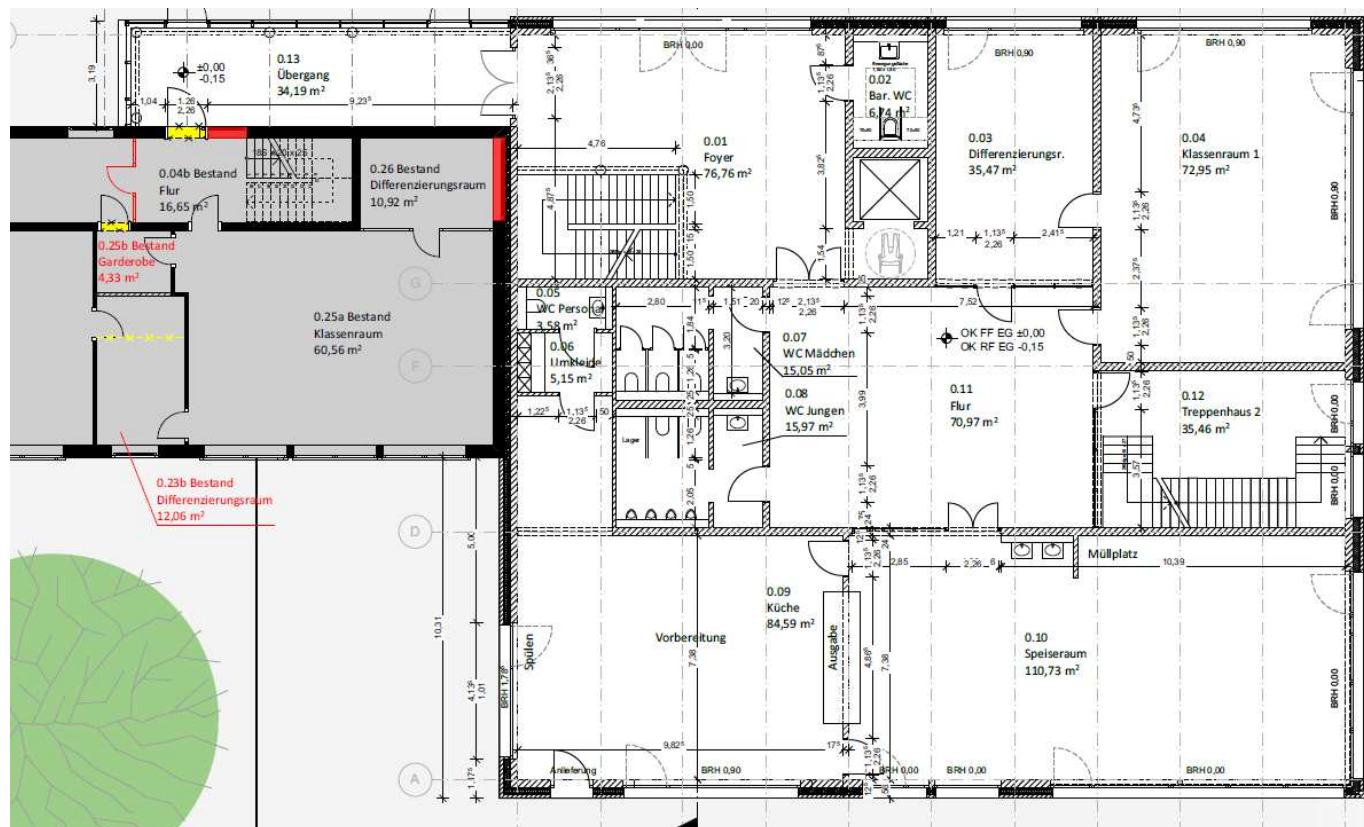


1. Obergeschoss

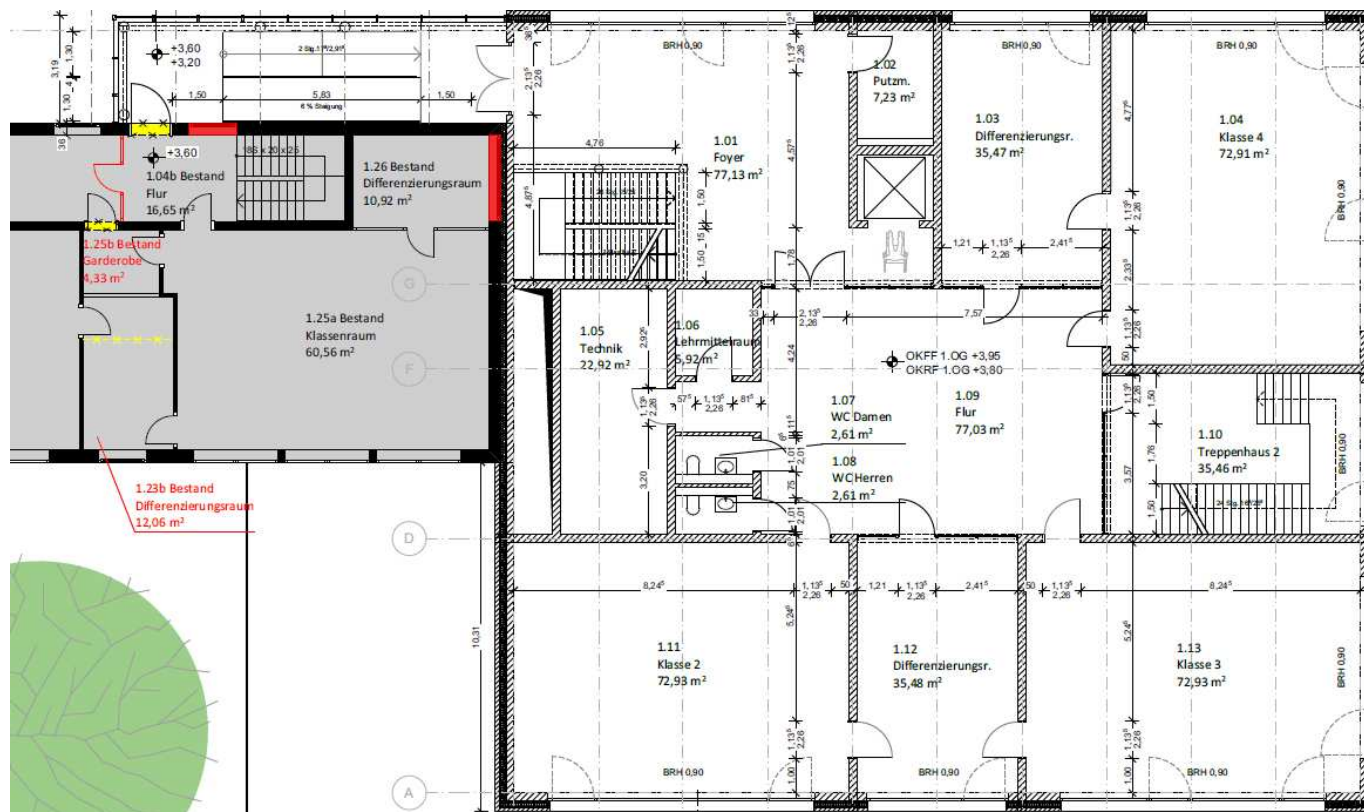


2. Obergeschoss

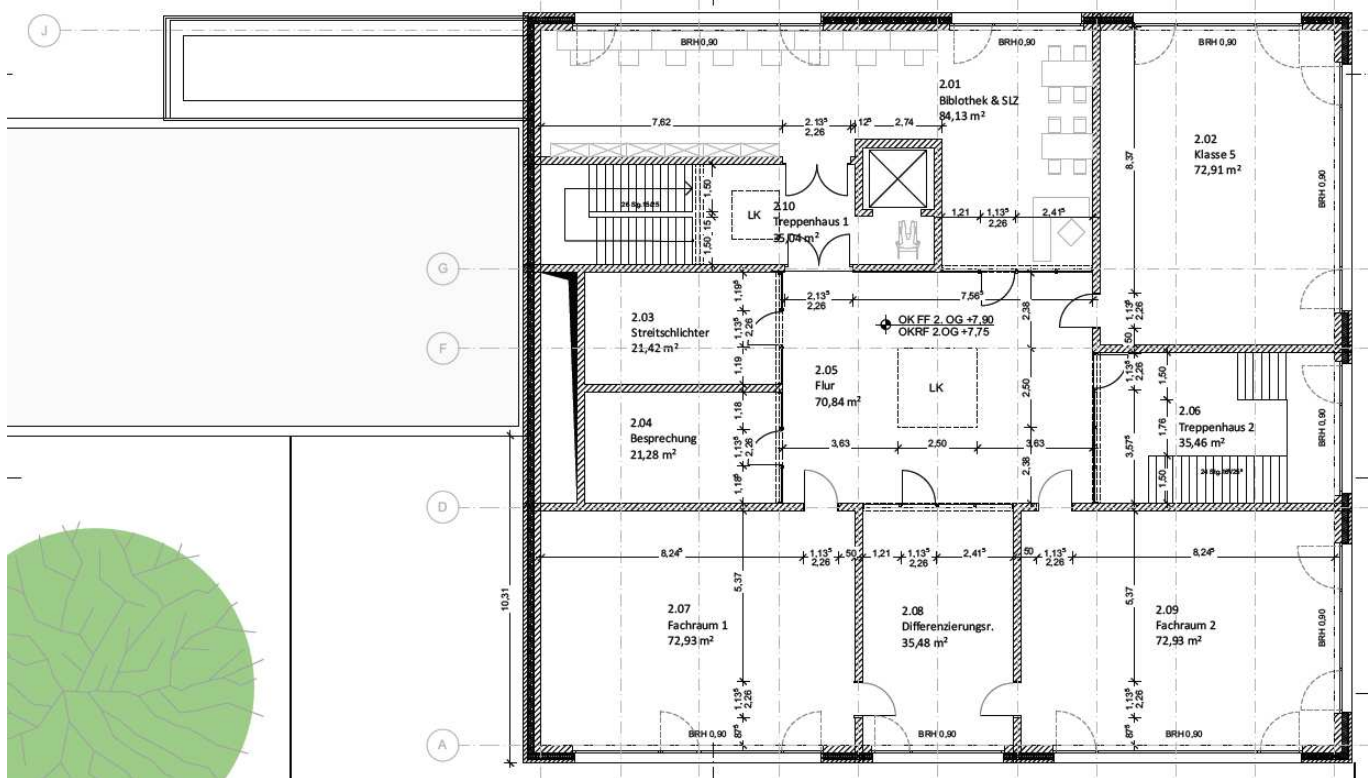

Ansicht Vorderseite (Stiftstraße)

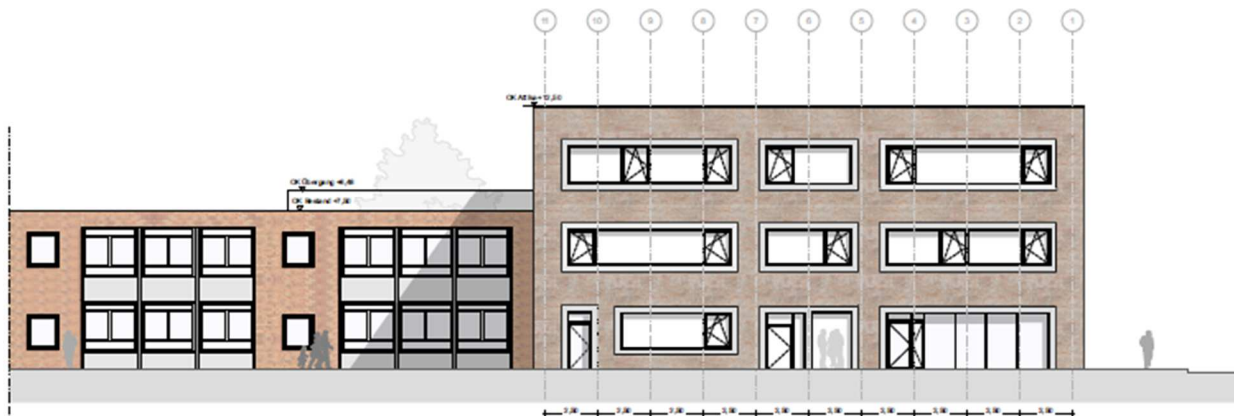

Ansicht Rückseite

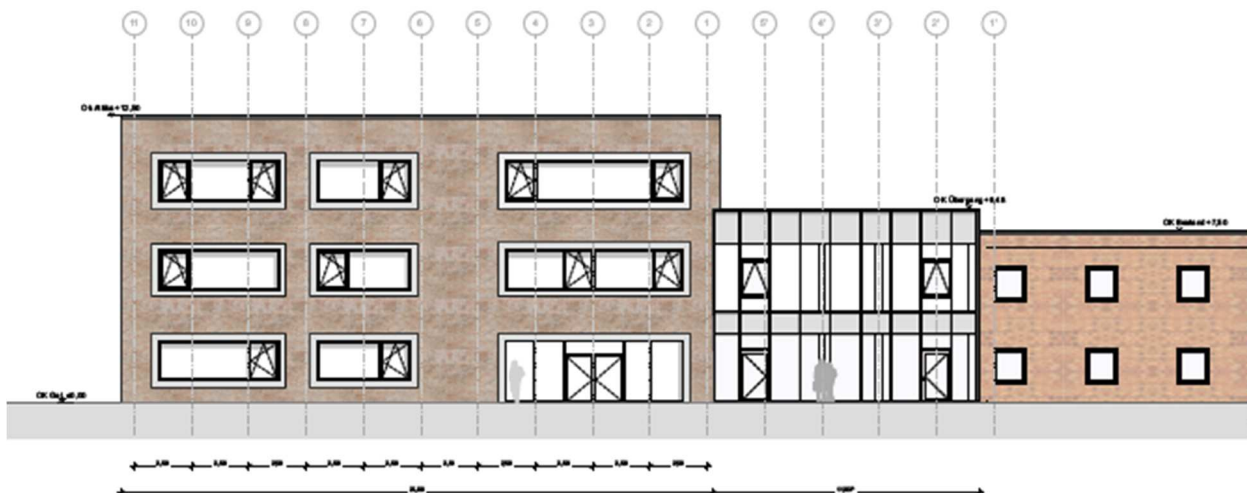

Maßnahmeplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel

Schule	Maßnahme für Mensa / Erweiterung OGS	Dringlichkeit BP	Rats- beschluss	KInvFöG II				
				2019	2020	2021	2022	2023
Alt Oberhausen								
Adolf-Feld-Schule	Mensa fertig gestellt / Anbau Aufgrund fehlender Differenzierungsmöglichkeit sind diese dringend zu schaffen, zumal dieser Bedarf in Alt-Oberhausen aufgrund der Anmeldungen zwingend erforderlich ist.	abgeschlossen / kurzfristig				Planung	Umsetzung	
Astrid-Lindgren-Schule	Die Ganztagsbetreuung erfolgt in der 200m entfernten Villa Wunderbar. Die Gruppenräume sind höchstens 45qm groß und die Mensa ist zu klein. Die neu definierten Standards an die Küche, Mensa und Betreuungsräume können nicht erfüllt werden. Ein Anbau ist auf dem Bolzplatz neben der Schule möglich. Durch eine Umstrukturierung der Räume, kann der Bestandsbau auf dem Schulhof als OGS-Gebäude genutzt werden. Die 5 entfallenden Klassenräume sind im Anbau zu ersetzen. Dazu werden eine Mensa, eine Bücherei (befindet sich im Lehrerzimmer) und ein fehlender Klassenraum zur 4-Zügigkeit errichtet. Eine Anpassung der Schule an die Schulbauleitlinie ist aufgrund der notwendigen Maßnahmen möglich.	kurzfristig				100.000,00 €	4.476.000,00 €	650.000,00 €
Bismarckschule	Die zu erneuernde Mensa befindet sich derzeit noch im Keller der Schule. Eine Mensa wird im Erdgeschoss errichtet. Die Zweizügigkeit wird nicht eingeschränkt. Wird über anderes Förderprogramm umgesetzt.	mittelfristig	11.03.2021					
Brüder-Grimm-Schule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Concordiaschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Falkensteinschule	Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich, weshalb die Mensa an die Erweiterung angebaut werden soll. Die dortige Bücherei wird in das Schulgebäude verlagert, um den OGS-Bereich komplett in den Anbau zu verlagern. Zur Anpassung der Schule an die Schulbauleitlinie wird der Anbau 2-geschossig errichtet.	in Umsetzung	19.11.2018			1.400.000,00 €	300.000,00 €	

Maßnahmeplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel

Schule	Maßnahme für Mensa / Erweiterung OGS	Dringlichkeit BP	Rats- beschluss	KInvFöG II				
				2019	2020	2021	2022	2023
Schule am Froschenteich	Die Mensa ist im Bestand zu erneuern. Damit die 3-Zügigkeit umgesetzt werden kann, ist eine weitere Halbetage einzubauen. Planungen und Kostenschätzungen liegen vor - Umsetzung wegen Überschreitung des GS2020-Budget über den städt. HH geplant. Keine Förderfähigkeit nach KInvFöG II. Baubeginn ab Frühjahr 2022	kurzfristig	18.11.2019					
Havensteinschule	Eine Küche nur für Warmausgabe soll errichtet werden. Diese wird in der ehemaligen HTD-Wohnung eingerichtet. Wird über anderes Förderprogramm umgesetzt.	langfristig	11.03.2021					
Landweherschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Luisenschule	Die Mensa wird im Erdgeschoss des OGS-Gebäudes eingerichtet. Durch Aufstockung des OGS-Gebäudes werden die hieraus verloren gehenden Gruppenräume ersetzt. Baubeginn ab Herbst 2021	mittelfristig	18.11.2019			300.000,00 €	800.000,00 €	
Marienschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Rolandschule	Zur Konkretisierung der Kosten im Rahmen des Sammelbeschlusses Umbau Mensen (Gute Schule 2020) wurde bei der Begehung festgestellt, dass ein Umbau im Bestand nur zu Lasten eines OGS-Gruppenraumes gehen würde. Da die Mensa im 2. Obergeschoss ist, wird eine Verlagerung notwendig. Eine neue Mensa wird im Bereich des Schulgartens errichtet. Die Rohbauarbeiten haben begonnen	in Umsetzung	03.07.2017/ 19.11.2018			610.000,00 €	300.000,00 €	
Ruhrschule	Die ehem. Hauptschule Alstaden wurde zu Grundschulzwecken hergerichtet. Die Maßnahme ist schlussgerechnet.	abgeschlossen	24.09.2018/ 14.09.2020					
Wunderschule	Die Mensa ist zu erweitern. Dafür ist ein Anbau am OGS-Gebäude notwendig. Die planungsrechtlichen Anforderungen sind noch zu erfüllen. Erste Entwürfe wurden der Stadtplanung zugeleitet.	kurzfristig				Planung	Planung	Umsetzung

Maßnahmeplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel

Schule	Maßnahme für Mensa / Erweiterung OGS	Dringlichkeit BP	Rats- beschluss	KlnvFöG II				
				2019	2020	2021	2022	2023
Sterkrade								
Alsfeldschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Grundschule Buschhausen	Zu prüfen ist die Zusammenlegung der Standorte. Die Kosten bei einer Beibehaltung der Standorte, die jeweils eine Mensa benötigen, wurden ermittelt. Ein VV-Beschluss zur weiteren Vorgehensweise ist herbeizuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zusammenlegung nicht förderfähig ist.	kurzfristig			Prüfung	Planung	ggfs. Umsetzung	
Hartmannschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Hirschkampfschule	Die Zusammenlegung an einem der bestehenden Standorte ist nicht umsetzbar. Eine Verlagerung in die Dep. Königshardt ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar. Freie Flächen für einen Neubau liegen nicht vor. Ausbau Mensen an beiden Standorten ist alternativ in Planung.	mittelfristig				Planung	Umsetzung	Umsetzung
Kastellschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Königschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Melanchthonschule	Es besteht noch ein Raumbedarf außerhalb des OGS. Der abgängige Pavillon und die WC-Anlage sollen ersetzt werden. Dazu werden 2 zusätzliche Klassenräume benötigt, so dass eine Finanzierung über KlnvFöG I nicht möglich ist. Durch den Ankauf eines Nachbargrundstücks ergeben sich baulich neue Optionen zur Vergrößerung des Schulhofs. Die Umplanungen wurden aufgenommen. Finanzierung nicht über KlnvFöG II vorgesehen.	OGS-Bereich erledigt						
Postwegschule	Zur Konkretisierung der Kosten im Rahmen des Sammelbeschlusses wurde bei der Begehung festgestellt, dass ein Umbau im Bestand nicht möglich ist. Ein Neubau hinter der Schule ist in Planung. Zugleich ist die HTD-Wohnung frei geworden. Eine mögliche schulische Nutzung ist in Prüfung.	langfristig			Planung	Umsetzung	Umsetzung	
Schule an der Oranienstr.	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen	25.09.2017					
Schwarze-Heide-Schule	Die Mensa kann nicht im Bestand erweitert werden, so dass ein Neubau notwendig ist. Eine erste Planung wurde verworfen. Weitere Planungen sind in 2021 aufgenommen worden. Diese werden über ein anderes Förderprogramm bezuschusst.	langfristig	11.03.2021			Planung	Planung	Umsetzung
Steinbrinkschule	Auf dem Nebengebäude wird eine zusätzliche Etage errichtet. Neben einer Mensa entstehen 2 OGS-Gruppenräume und ein OGS-Büro.	in Umsetzung	19.11.2018		900.000,00 €	1.225.050,00 €		

Maßnahmeplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel

Schule	Maßnahme für Mensa / Erweiterung OGS	Dringlichkeit BP	Rats- beschluss	KInvFöG II				
				2019	2020	2021	2022	2023
Osterfeld								
Erich Kästner-Schule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Jacobischule	Ein Umbau im Bestand ist nicht möglich, weshalb für die Mensa ein Neubau errichtet werden soll. Umplanung wurde wegen der Anmerkungen im Gestaltungsbeirat notwendig. Die Arbeiten beginnen im August	in Umsetzung	19.11.2018			200.000,00 €	520.000,00 €	
Overbergschule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Robert-Koch-Schule	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Schule am Siedlerweg	Die Mensa ist fertiggestellt.	abgeschlossen						
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	Errichtung eines Neubaus zur Verlagerung der Dependance an den Hauptstandort	in Umsetzung	19.03.2018	52.545,00 €	1.900.000,00 €	2.763.455,00 €		
				52.545,00	2.800.000,00	6.598.505,00	6.396.000,00	650.000,00
				16.497.050,00				

(Die Kosten beinhalten nur die Baukosten - nicht förderfähige HOAI-Anteile werden gesondert über den städtischen Haushalt finanziert)

In Planung befindliche Maßnahmen über KInvFöG II (nur erster Kostenrahmen)		
Adolf-Feld-Schule	s. o.: Erweiterung	1.350.000,00 €
Wunderschule	s. o.: Erweiterung OGS-Gebäude / Mensa	850.000,00 €
Hirschkampfschule	s. o.: Errichtung Mensen an beiden Standorten und Erweiterungsbedarf Walsumermark	1.000.000,00 €
Postweg	s. o.: Errichtung Mensa & ggfs. Umbau HTD Wohnung	710.000,00 €
Schwarze-Heide-Schule	s. o.: Errichtung Mensa & ggfs. Erweiterungsbedarf	1.000.000,00 €
Grundschule Buschhausen	Zusammenlegung oder Mensen an beiden Standorten	1.030.000,00 €
offene KIF II - Maßnahmen		5.940.000,00 €

	KInvFöG II (inkl. Eigenanteil)
Budget	22.845.223,00 €
abzgl. Planung w. o.	16.497.050,00
	6.348.173,00 €
